



経営管理システム

原価指南

GENKA SHINAN

建設系企業向け
SCC会員専用
コンサルティングツール



一ゆとりある企業づくりをサポートする—
株式会社建設ドットウェブ

帳表サンプル集

受注登録
簡易予算

日報入力
出面管理

勤怠データ

他社製各種
給与計算
システム

仕入・支払
買掛管理

仕訳データ

全国主要メーカー製
会計システム

売上・入金
売掛管理

原価集計
限界利益管理
各種データ分析



簡単 &
充実機能で
経営をしっかり
サポート

＜対応業種＞ 项目名称変更機能で個別受注型製造業にも対応

建設業 総合建設、土木、とび、舗装、造園、建築、内装、リフォーム、設備、電気、防水、塗装、基礎、鉄筋、型枠、板金、さく井、その他

その他 測量・設計コンサルタント、ソフトウェア受託開発、メンテナンスサービス、広告宣伝、機械器具設置、その他個別受注製造・施工業全般

目次

カテゴリ	帳表名	ページ
工事受注 簡易予算 完成工事	工事一覧表	1
	工事情報	
	受注工事一覧表(工事別)	2
	受注工事一覧表(部門別)	
	受注工事一覧表(発注者別)	
	受注工事一覧表(受注日別)	－
	受注完成高推移表(受注区分別)	3
	受注完成高推移表(部門別)	
	工事経歴書	4
日報・勤怠	原価日報	5
	日報確認表	6
	出面管理表(標準)	7
	出面管理表(工事別)	
	出勤明細表	9
	出面帳	
	労務管理表(社員別)	10
	労務管理表(工事別) 工事順	
	機械稼働表	11
	機械管理表(機械順)	
	機械管理表(工事順)	
仕入	仕入伝票一覧表	12
	仕入明細一覧表	
	仕入集計表(業者別)	13
	仕入集計表(工事別)	
	仕入集計表(要素別)	
	仕入明細集計・分析表	14
支払 買掛管理	支払伝票一覧表	15
	支払明細一覧表	
	買掛残高一覧表	16
	仕入支払推移表	
	仕入元帳	17
売上・入金 請求管理	売上伝票一覧表	18
	売上明細一覧表	
	入金伝票一覧表	19
	入金明細一覧表	
	受取手形明細表	
	請求書(納品書)	20
	請求書(請求先別)	21
	請求書(工事別)	
	請求一覧表(請求先別)	22
	請求一覧表(工事別)	
	請求一覧表(回収予定日別)	
	請求一覧表(営業担当者別)	23
	請求一覧表(工事別)	
売掛・回収管理	売掛残高一覧表(発注者別)	24
	売掛残高一覧表(工事別)	
	売掛残高一覧表(請求先別)	－
	売掛残高一覧表(部門別)	
	売上元帳(発注者別)	25
	売上元帳(請求先別)	－

カテゴリ	帳表名	ページ
売掛・回収管理	工事回収予定表	26
	工事回収実績表	
	売上入金推移表(発注者別)	27
	売上入金推移表(工事別)	
	売上入金推移表(請求先別)	－
売上・入金 仕入集計	売上明細集計・分析表	28
	売上仕入分析表	29
工事原価管理	原価配賦チェックリスト	30
	工事別原価管理表(部門順)	31
	工事別原価管理表(発注者順)	
	工事別原価管理表	
	発注者別原価管理表	32
	部門別原価管理表	
	現場担当別原価管理表	33
	営業担当別原価管理表	
	工事台帳(日付別)	34
	工事台帳(要素別日付順)	
	工事台帳(要素別)	35
	工事台帳(業者別)	36
	工事別原価科目集計表	
	工事原価推移表(要素別)	37
	工事原価推移表(業者別)	－
データ分析 限界利益管理	見込売上一覧表	39
	生産性向上一覧表	41
	生産性向上推移表	43
	受注推移表	45
	受注分析表(部門別)	47
	受注分析表(営業担当別)	
	受注分析表(工事担当別)	48
	限界利益確認表	
会計連動 給与連動	仕訳データ確認表	49
	仕訳データ受入リスト	
	勤怠データ確認表	
基本データ管理	業者一覧表(基本情報)	50
	業者一覧表(支払情報)	
	業者タックシール	
	業者評価表(製品納入業者別)	51
	業者評価表(施工業者別)	
	発注者一覧表	52
	発注者一覧表(回収情報)	
	発注者タックシール	
	社員情報	53
	社員一覧表	
	社員資格台帳	54
	資格免許一覧表	
	機械一覧表	55
	保有設備一覧表	

登録された工事の情報です。簡易実行予算(要素別)と発生原価との差異も確認できます。

工事一覧表

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社
『表示順:工事(コード)順 昇順』『未成・完成:未成』

工事 発注者	フリガナ 部門	営業担当者 現場代理人	主任技術者 監理技術者	受注日 完成日	契約工期 (開始) 実施工期 (開始)	契約工期 (終了) 実施工期 (終了)	請負税抜額 請負消費税	請負金額 税込
D2001000-00	***** 土木部 *****	ドボク			~	~	0	0
D2001002-00	豊頃川改修護岸 2 工区	トコカラ	101 鈴木 慎一郎	104 柴田 久雄	XX/09/20	XX/10/01 ~ XX/06/30	24,000,000	25,920,000
101	東川建設 (株)	土木部	104 柴田 久雄		XX/10/01 ~ XX/06/20		1,920,000	
D2001999-00	その他小工事	ショコラジ			~	~	0	0
	土木部	土木部			~	~	0	
K2002000-00	***** 建築部 *****	ケチク			~	~	0	0
					~	~	0	
K2002002-00	池田町多目的ホール工事	ゲンカチュウタクテ	108 加藤 健一	103 杉山 雅博	XX/03/15	XX/04/01 ~ XX/10/30	100,000,000	108,800,000
104	北秋田市土木事務所	建築部	102 林 健二		XX/10/22 ~ XX/10/30		8,800,000	
K2002002-00	池田町多目的ホール工事	ゲンカチュウタクテ			XX/04/01 ~ XX/10/30		24,000,000	25,920,000
					XX/10/22 ~ XX/10/30		1,920,000	

工事情報

Page. 1

どっと建設株式会社

20XX/07/30

承 認	確 認	作 成

『表示順:工事(コード)順 昇順』『未成・完成:両方』

工事	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	受注日	XX/03/15
	池田町多目的ホール建設工事	契約工期 (開始)	XX/04/01
		契約工期 (終了)	XX/10/30
フリガナ	ゲンカチュウタクテ	実施工期 (開始)	XX/05/01
工事場所	池田町南川地内	実施工期 (終了)	XX/10/30
		完成日	
発注者	104 北秋田市土木事務所	工事区分	
請求先	104 北秋田市土木事務所	入札区分	
工事設計者	株式会社 大空設計事務所	回収条件	
工事概要	集会場	工事状況	
	鉄骨造平屋(機械室一部2階)	工事期間	
		工事条件 6	
		工事条件 7	
部門	2 建築部	工事条件 8	
営業担当者	108 加藤 健一	工事条件 9	
現場代理人	102 林 健二	工事条件 1 0	
主任技術者	103 杉山 雅博	工事種類	20 建築一式工事
監理技術者		経都道府県	5 秋田県
主任技術 2		市区町村	
監理技術 2		請負区分	1 元請
J V 区 分		単 価 区 分	1 自社単価
属 性 区 分	0 標準工事	一般管理费率	5.00 %
受注区分	1 官公庁発注工事	工 種 管 理	3 種別
工事備考		協 会 費	1 対象
		請求書発行	1 する

			工事更新日 XX/07/15		
	金 額	率	要 素	実行予算(税抜)	工事原価(税抜)
請負税込額	108,800,000		材料費	71,046,000	62,760,756
入 金 額	10,800,000		労務費	100,000	40,756
未 収 金	98,000,000		外注費	6,850,000	5,772,270
請負税抜額	100,000,000		直接経費	400,000	670,757
目 標 利 益	21,604,000	21.60 %	経費 1	0	0
請負-原価	30,755,461	30.76 %	経費 2	0	0
一般管理	3,000,000	5.00 %	経費 3	0	0
費 (変更)	5,000,000	5.00 %	経費 4	0	0
			合 計	78,396,000	69,244,539
					9,151,461

受 注 (請 負 金 額)						
受注日	契約工期	完成日	税抜金額	消費税額	税込金額	税率
XX/03/15	XX/04/01	XX/10/30	60,000,000	4,800,000	64,800,000	8.0%
XX/07/15	XX/08/01	XX/10/30	40,000,000	4,000,000	44,000,000	10.0%
合 計			100,000,000	8,800,000	108,800,000	

入 金 予 定				要
日 付	区分	入 金 予 定 額	摘	
XX/10/31	振込	54,000,000	前受金	
XX/04/30	振込	27,000,000		
XX/10/31	振込	27,000,000		
合 計		108,000,000		

受注状況と完成残高が確認できます。工事別・受注日別・部門別・発注者別に集計できます。

受注工事一覧表 (工事別)										Page. 1		税抜		20XX/01/10							
原価指南株式会社										『表示順:部門順 昇順』『期間:XX/12/01~XX/12/31』『税選択:税抜』『金額0円表示:0円明細は表示しない』『未成・完成:両方』		税抜									
工事		発注者		部門	受注区分	営業担当者	受注日	契約工期	前回受注額							内完成分	今回受注残				
X2008001-00	ロビンソン除害施設維持管理	建築部	山口 明夫	XX/10/01	XX/09/30	XX/10/01	XX/09/30	2,580,000	0							2,580,000					
106 松阪開発公社	民間元請工事	民間元請工事	中村 秀樹	XX/10/01	XX/09/30	XX/10/01	XX/09/30	1,200,000	0							1,200,000					
106 松阪開発公社	民間元請工事	民間元請工事						3,780,000	0							3,780,000					
《 小 計 》																					
S2003003-01	横浜市中区天池町維持修繕工事	設備部	杉山 雅博	XX/10/02	XX/12/14	XX/10/03	XX/12/31	8,500,000	0	8,500,000	0	0									
105 (株) 横浜土木	民間下請工事	民間下請工事	柴田 久雄	XX/12/14	XX/10/05	XX/10/05	XX/12/29	0	8,500,000	0	8,500,000	0									
原価指南株式会社										Page. 1		受注工事一覧表 (部門別)		Page. 1							
『表示順:部門順 昇順』『期間:XX/12/01~XX/12/31』『税選択:税抜』『金額0円表示:0円明細は表示しない』『未成・完成:両方』										20XX/01/10		税抜									
部門	前回受注額	今回受注額	内完成分	今回受注残																	
1 土木部	63,000,000	0	0	63,000,000																	
2 建築部	206,380,000	42,000,000	0	247,780,000																	
3 設備部	18,347,710	0	16,500,000	1,847,710																	
4 電気部	31,193,235	0	0	31,193,235																	
5 舗装部																					
原価指南株式会社										Page. 1		受注工事一覧表 (発注者別)		Page. 1							
『表示順:発注者順 昇順』『期間:XX/12/01~XX/12/31』『税選択:税抜』『金額0円表示:0円明細は表示しない』『未成・完成:両方』										20XX/01/10		税抜									
発注者	前回受注額	今回受注額	内完成分	今回受注残																	
101 東川建設 (株)	63,600,000	0	15,000,000	48,000,000																	
103 佐賀市役所土木課	50,500,000	0	0	50,500,000																	
104 北秋田市土木事務所	60,000,000	40,000,000	0	100,000,000																	
105 (株) 横浜土木	82,900,000	2,000,000	8,500,000	76,400,000																	
106 松阪開発公社	3,780,000	0	0	3,780,000																	

受注完成高推移表(受注区分別/部門別)

〈A 4 横〉

毎月の受注・完成高の推移が受注区分・部門別に確認できます。受注区分・部門は任意に設定できます。

Page. 1
20XX/07/10
※上段：当月 下段：累計

受注完成高推移表(受注区分別)

税抜

年月	官公庁発注工事		民間元請工事		官庁下請工事		民間下請工事		その他		未設定		合計	
	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高
前回受注残	0		0		0		0		0		0		0	
XX/07/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX/09	34,194,000	0	99,000,000	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	157,194,000	0
XX/10	111,000,000	0	39,280,000	0	49,750,000	0	8,900,000	0	61,990,945	0	0	0	157,194,000	0
XX/11	145,194,000	0	138,280,000	0	73,750,000	0	8,900,000	0	61,990,945	0	0	0	428,114,945	0
XX/12	40,000,000	8,000,000	2,000,000	0	78,750,000	0	8,900,000	0	66,990,945	0	0	0	44,000,000	31,500,000
XX/01	185,194,000	8,000,000	140,280,000	0	78,750,000	15,000,000	8,900,000	8,500,000	68,990,945	600,000	0	0	482,114,945	32,100,000
	0	0	5,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	24,000,000

Page. 1
20XX/07/10
※上段：当月 下段：累計

受注完成高推移表(部門別)

税抜

年月	土木部		建築部		設備部		電気部		舗装部		合計	
	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高	受注	完成高
前回受注残	0		0		0		0		0		0	
XX/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XX/09	24,000,000	0	99,000,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	130,500,000	0
XX/10	34,000,000	0	107,380,000	0	10,847,710	0	31,193,235	0	45,000,000	0	228,420,945	0
XX/11	58,000,000	0	206,380,000	0	18,347,710	0	31,193,235	0	45,000,000	0	358,920,945	0
XX/12	63,000,000	0	206,380,000	600,000	18,347,710	0	31,193,235	0	50,000,000	0	368,920,945	600,000
XX/01	63,000,000	0	253,380,000	24,600,000	18,347,710	16,500,000	31,193,235	0	52,000,000	15,000,000	412,920,945	32,100,000
	0	0	5,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	24,000,000

官公庁届け出書類です。工事登録時、工事経歴書項目を入力することで作成できます。

〈A 4 横〉

様式第二号 (第二条、第十九条の八関係)

(用紙A4)

書
歷
經
事
工

建設工事の種類) 土木一式工事 (税込・○税抜)

[illegible]

使用材料・機材・労務の内訳や報告内容が確認できます。

原価日報

原価指南株式会社

Page. 1
20XX/10/20

承認	確認	作成

日付	20XX/10/20 (水)	天気	曇り	気温	最高: 18.0 最低: 10.0	作成者	102	林 健二
工事	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事				発注者	105	(株) 横浜土木
契約	XX/10/6	～	XX/1/31	実施		XX/10/6	～	XX/5/20

【原価内訳】

品名	要素内訳	仕入先／業者	数量	単位	単価	金額
アスファルト合材	未成材料費	金沢地区生コンクリート協	1.00	t	8,500.0	8,500
《 要素内訳計 》						8,500
《 合 計 》						8,500

【労務内訳】

社員	開始時刻	終了時刻	作業時刻	就業内 (h)	普通残業 (h)	深夜残業 (h)	早出残業 (h)	休日 (h)	手当 1 (日)	手当 2 (回)	手当 3 (日)
林 健二	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中村 正人	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
西川 隆宏	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
松嶋 七雄	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岡村 信吾	8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
《 合 計 》				40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【機械内訳】

機械	自社 (h)		自社 (日)		未利用 (日)		未利用 (日)	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
バックホウ0.35m3 (7215)	0.00	0	1.00	20,000	0.00	0	0.00	0
バックホウ0.35m3 (9143)	0.00	0	1.00	20,000	0.00	0	0.00	0
《 合 計 》	0.00	0	2.00	40,000	0.00	0	0.00	0

【摘要】

ブルドーザ掘削押土・バックホウ掘削積込

指定した期間・工事などで日報がリスト化できます。

Page. 1
20XX/10/20

日報確認表

原価指南株式会社
『期間: XX/10/20~XX/10/20』『未成・完成: 両方』『作成者: 未登録・OFF』

<日報情報>

工事コード	工事	日付	天気	最低 気温	最高 気温	作成者コード	作成者
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	曇り	18.0	10.0	102 林 健二	
P0000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20				0	

<原価内訳>

工事コード	工事	日付	要業	品名	品目	業者	数量	単位	単価	金額	費目	工種	種別
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	19/10/20	材料費	アスファルト合材	アスファルト合材	金沢地区生コンクリート協同組	1.00	t	8,500.0	8,500	(省略)		
《 工 事 計 》											8,500		
《 合 計 》											8,500		

<労務内訳>

工事コード	工事	日付	社員コード	社員	開始 時刻	終了 時刻	作業 (h)	就業内 (h)	普通残業 (h)	深夜残業 (h)	早出残業 (h)	休日 (h)	手当 1 (日)	手当 2 (回)	手当 3 (日)	費目	工種	種別
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	102 林 健二		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	116 中村 正人		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	117 西川 隆宏		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	118 松嶋 七雄		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	119 岡村 信吾		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
《 工 事 計 》											40.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	101 鈴木 慎一郎		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	102 林 健二		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	103 杉山 雅博		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	104 柴田 久雄		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	105 中村 秀樹		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	106 後藤 清		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	107 山口 明夫		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	108 加藤 健一		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	109 田中 信二		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
P00000003-00	第三高校増設工事	XX/10/20	110 岡本 孝博		8:00	17:00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(省略)		
《 工 事 計 》											80.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
《 合 計 》											120.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

<機械内訳>

工事コード	工事	日付	機械コード	機械	自社 数量	自社 (h)	未利用 数量	未利用 (日)	未利用 数量	未利用 (日)	業者	費目	工種	種別
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	301 バックホウ 35m3 (7215)		0.00	3,340.0	0.00	20,000.0	0.00	0.00	社内原価	(省略)		
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	302 バックホウ 35m3 (9143)		0.00	3,340.0	0.00	20,000.0	0.00	0.00	社内原価	(省略)		
《 工 事 計 》											0.00			
《 合 計 》											0.00			

<作業内容>

工事コード	工事	日付	内容
D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	XX/10/20	ブルドーザ掘削押土・バックホウ掘削積込

出面管理表(標準/工事別)

〈A 3 横〉

日報入力や勤怠入力で登録した出面(勤怠)データ1カ月分を全社(標準)・工事別に集計できます。

出面管理

原価指南株式会社

『期間:XX/10/01~XX/10/31』『未成・完成:両方』

社員 社員区分		項目	10/1 (水)	10/2 (木)	10/3 (金)	10/4 (土)	10/5 (日)	10/6 (月)	10/7 (火)	10/8 (水)	10/9 (木)	10/10 (金)	10/11 (土)	10/12 (日)	10/13 (月)	10/14 (火)	10/15 (水)
102	林 健二	就業内															8.00
9	その他	普通残業															0.00
		深夜残業															0.00
103	杉山 雅博	就業内											4.00				
9	その他	普通残業															
		深夜残業															
104	柴田 久雄	就業内	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50				7.50	7.50	7.50
9	その他	普通残業															
		深夜残業															
109	田中 信二	就業内															
1	社員	普通残業															
		深夜残業															
111	田中 博	就業内											4.00				
2	作業員	普通残業															
		深夜残業															
112	渡辺 宏	就業内															8.00
2	作業員	普通残業															
		深夜残業															
113	山田 健太郎	就業内															8.00
2	作業員	普通残業															
		深夜残業															
114	佐藤 一郎	就業内															4.00

出面管

どっと建設株式会社

『期間:XX/10/01~XX/10/31』『未成・完成:両方』

工事 : D2001001-00 県道15号線道路改良工事

社員 社員区分		項目	10/1 (水)	10/2 (木)	10/3 (金)	10/4 (土)	10/5 (日)	10/6 (月)	10/7 (火)	10/8 (水)	10/9 (木)	10/10 (金)	10/11 (土)	10/12 (日)	10/13 (月)	10/14 (火)
102	林 健二	就業内														
9	その他	普通残業														
		深夜残業														
103	杉山 雅博	就業内											4.00			
9	その他	普通残業														
		深夜残業														
109	田中 信二	就業内														
1	社員	普通残業														
		深夜残業														
111	田中 博	就業内											4.00			
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														
112	渡辺 宏	就業内														
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														
113	山田 健太郎	就業内														
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														
114	佐藤 一郎	就業内														
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														
115	石原 次郎	就業内														
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														
116	中村 正人	就業内														
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														
117	西川 隆宏	就業内														
2	作業員	普通残業														
		深夜残業														

表(標準)

Page. 1
20XX/11/10

10/16 (木)	10/17 (金)	10/18 (土)	10/19 (日)	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	日数	合計(h)
8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00				11.00	88.00 0.00 0.00
																1.00	4.00 0.00 0.00
7.50	7.50															14.00	105.00 0.00 0.00
													8.00		8.00	2.00	16.00 0.00 0.00
																1.00	4.00 0.00 0.00
	8.00	8.00														3.00	24.00 0.00 0.00
	8.00	4.00														3.00	20.00 0.00 0.00
	8.00	8.00														3.00	20.00

理表(工事別)

Page. 1
XX/11/10

10/15 (水)	10/16 (木)	10/17 (金)	10/18 (土)	10/19 (日)	10/20 (月)	10/21 (火)	10/22 (水)	10/23 (木)	10/24 (金)	10/25 (土)	10/26 (日)	10/27 (月)	10/28 (火)	10/29 (水)	10/30 (木)	10/31 (金)	日数	合計(h)
8.00 0.00 0.00	8.00	8.00	8.00		8.00	8.00	8.00		8.00	8.00		8.00	8.00				11.00	88.00 0.00 0.00
																	1.00	4.00 0.00 0.00
														8.00		8.00	2.00	16.00 0.00 0.00
																	1.00	4.00 0.00 0.00
8.00		8.00	8.00														3.00	24.00 0.00 0.00
8.00		8.00	4.00														3.00	20.00 0.00 0.00
4.00		8.00	8.00														3.00	20.00 0.00 0.00
																8.00	1.00	8.00 0.00 0.00
4.00		4.00	4.00		8.00	8.00	8.00		8.00	8.00							8.00	52.00 0.00 0.00
					8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00		4.00	4.00				8.00	56.00 0.00 0.00

日報入力や勤怠入力で登録した社員ごとの出面(勤怠)データを出勤した時間帯別に1カ月分全で一覧表示します。一日に複数の工事に出勤した場合、出勤明細表は複数行、出面帳は工事欄に複数の工事名が表示されます。

日報入力や勤怠入力で登録した社員ごとの出面(勤怠)データを出勤した時間帯別に1カ月分全で一覧表示します。一日に複数の工事に出勤した場合、出勤明細表は複数行、出面帳は工事欄に複数の工事名が表示されます。

Page. 1
20XX/1/10

期間： XX/12/1 ～ XX/12/31

氏名 (104 柴田 久雄)

日付	工事	開始時刻	終了時刻	就労時間	就業内	普通残業	深夜残業	出残業	休日	手当1	手当2	手当3	備考
XX/12/1 (月)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/2 (火)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/3 (水)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/4 (木)	国道2号線道路改良工事	8:00	19:00	10.00	8.00	2.00							
XX/12/5 (金)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/7 (日)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00					8.00				
XX/12/8 (月)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/9 (火)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/10 (水)	国道2号線道路改良工事	8:00	12:00	4.00	4.00								
XX/12/11 (木)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/15 (月)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/16 (火)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								
XX/12/18 (木)	第2工区川瀬町配管布設工事	8:00	17:00	8.00	8.00								

Page. 1

氏名： 104 柴田 久雄

所定休日

[illegible]

労務管理表(社員別/工事別)

〈A 4 横〉

日報入力や勤怠入力で登録した出面(勤怠)データを社員別・工事別に集計できます。

Page. 1
20XX/1/10

労務管理表(社員別)

どっと建設株式会社

『期間:XX/12/01~XX/12/31』 『未成・完成:両方』

社員	日計	時間計	金額計	数量		金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
				就業内(h)	休日(h)		普通残業(h)	深夜残業(h)	早出残業(h)			
101 鈴木 慎一郎 1 社員	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000						
102 林 健二 9 その他	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000						
103 杉山 雅博 9 その他	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000						
104 柴田 久雄 9 その他	44.75	358.00	1,138,960	348.00	8.00	1,108,000	2.00	6,000				
105 中村 秀樹 9 その他	44.38	355.00	1,126,600	352.00		1,117,600	3.00	9,000				
106 後藤 清 9 その他	47.00	376.00	1,175,200	376.00		1,175,200						
107 山口 明夫 1 社員				248.00		868,000						

Page. 1
20XX/01/10

労務管理表(工事別)

原価指南株式会社

『表示順:工事順 昇順』 『期間:XX/12/01~XX/12/31』 『社員:104~最後』

社員	工事	日計	時間計	金額計	数量		金額	数量	金額	数量	金額
					就業内(h)	休日(h)		普通残業(h)	深夜残業(h)	早出残業(h)	
112 渡辺 宏 2 作業員	D2001002-00 豊頃川改修護岸2工区	0.50	4.00	9,600		4.00	9,600				
113 山田 健太郎 2 作業員	D2001002-00 豊頃川改修護岸2工区	9.25	74.00	189,960	56.00	8.00	134,400	9.00	27,000	1.00	3,600
114 佐藤 一郎 2 作業員	D2001002-00 豊頃川改修護岸2工区	8.00	64.00	112,880	56.00	8.00	95,200				
《 工 事 計 》											
104 柴田 久雄 9 その他	P0000003-00 第三高校増設工事	17.75	142.00	312,440	116.00	16.00	239,200	9.00	27,000	0.00	0.00
105 中村 秀樹 9 その他	P0000003-00 第三高校増設工事	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000	0.00	0.00	0.00	
106 後藤 清 9 その他	P0000003-00 第三高校増設工事	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000				
107 山口 明夫 1 社員	P0000003-00 第三高校増設工事	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000				
108 加藤 健一 1 社員	P0000003-00 第三高校増設工事	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000				
109 田中 信二 1 社員	P0000003-00 第三高校増設工事	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000				
110 岡本 孝博 1 社員	P0000003-00 第三高校増設工事	31.00	248.00	868,000	248.00		868,000				
《 工 事 計 》											
104 柴田 久雄 9 その他	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	217.00	1,736.00	6,076,000	1,736.00	0.00	6,076,000	0.00	0.00	0.00	0.00
113 山田 健太郎 2 作業員	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	12.00	96.00	236,160	88.00	8.00	211,200				
117 西川 隆宏 2 作業員	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	9.00	72.00	172,800	72.00		172,800				
122 小林 涼一 2 作業員	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	13.00	104.00	312,000	104.00		312,000				

日報入力や機械稼働入力で登録した機械稼働データが機械・日付別に一覧表示できます。また、工事別・機械工事別・機械別に集計できます。

Page. 1
20XX/01/10

機械稼働表

原価指南株式会社
『期間: XX/12/01~XX/12/31』『機械: 102~102』『未成・完成: 両方』
機械 : 102 プルトーザ 4t No. 222-3044

作業日	工事	自社 (h)	自社 (日)	未利用 (日)	未利用 (日)	備考
XX/12/01 (月)	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
XX/12/02 (火)	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
XX/12/03 (水)	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
XX/12/04 (木)	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	
XX/12/10 (木)	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事	0.00	1.00	0.00	0.00	

Page. 1
20XX/12/10

機械管理表

原価指南株式会社
『表示順: 機械順 昇順』『期間: XX/11/01~XX/11/30』『機械: 202~502』

機械	工事	金額計		数量		単価		金額		数量		単価		金額	
						自社 (h)		未利用 (日)				自社 (日)		未利用 (日)	
202 プルトーザ 4t B 1 重機	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			0.00	0.00	3,000.0	0.0			2.00	24,000.0			48,000	
202 プルトーザ 4t B 1 重機	S2003001-00 第2工区川瀬町配管布設工事			0.00	0.00	3,000.0	0.0			4.00	24,000.0			96,000	
《 機 械 計 》				0.00	0.00					6.00				144,000	
301 プルトーザ 35m3 (7215)	D2001001-00			0.00	0.00	3,340.0				2.00	15,000.0			40,000	

Page. 1
20XX/12/10

機械管理表

原価指南株式会社
『表示順: 工事順 昇順』『期間: XX/11/01~XX/11/30』『未成・完成: 両方』

機械	工事	金額計		数量		単価		金額		数量		単価		金額	
						自社 (h)		未利用 (日)				自社 (日)		未利用 (日)	
103 プルトーザ 6t No. 567-0188 1 重機	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			0.00	0.00	3,000.0				6.00	24,000.0			144,000	
202 プルトーザ 4t B 1 重機	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			0.00	0.00	3,000.0	0.0			2.00	24,000.0			48,000	
301 プルトーザ 35m3 (7215) 1 重機	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			0.00	0.00	3,340.0	0.0			2.00	15,000.0			40,000	
401 振動ロー 0.8-1.1t プルトーザ 9 その他	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			4.00	0.00	650.0				0.00	5,000.0				
452 タイヤロー 8~20t 1 重機	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			8.00	0.00	550.0				0.00	4,420.0				
502 社用バス 12号車 2 工事車両	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事			2.00	0.00	600.0				0.00	4,800.0				
《 工 事 計 》				14.00	0.00					10.00				232,000	
100 プルトーザ 35m3 (7215)	D2001001-00			0.00	0.00	1,950.0				4.00	10,000.0			40,000	

仕入伝票一覧表/仕入明細一覧表

〈A 4 横〉

仕入伝票入力の確認リストです。

原価指南株式会社

『表示順:伝票番号順 昇順』『期間:XX/10/01~XX/10/31』『業者:200~226』

仕入伝票一覧表

Page. 1
20XX/11/15

伝票日付	伝票番号	業者	工事	税抜金額	消費税	税込金額	注文番号	支払予定日	摘要
14/10/31	205	210 (株) 光電気	V2004002-00 第一小学校2~3F電灯改修工事	143,000	14,300	157,300		XX/11/30	
14/10/31	210	226 アサテック (株)	K2002001-00 中央駅南新築工事	1,365,000	136,500	1,501,500		XX/11/30	
14/10/31	218	223 (株) 池太組	K2002003-00 栗田邸新築工事	190,000	19,000	209,000		XX/11/30	
14/10/31	256	224 (有) アイコーボレーション	K2002003-00 栗田邸新築工事	340,000	34,000	374,000		XX/11/30	

原価指南株式会社

『表示順:業者(コード)順 昇順』『期間:14/10/01~14/10/31』『業者:200~224』

仕入明細一覧表

Page. 1
20XX/11/15

日付	伝票番号	行	業者	工事	品名	規格	数量	単位	税区分	単価	税率	税抜金額	消費税	税込金額	費目	工種	種別	備考1	備考2
XX/10/31	205	1	V2004002-00	210 (株) 光電気	0000-0813-000135	電線 (IV-VVF-VVR-VCT-CV-FP)	500.00	m		6.0		3,000	300		(省略)				
XX/10/31	205	2	V2004002-00	210 (株) 光電気	0000-0923-000202	材料費	50.00	m		2,800.0		140,000	14,000		(省略)				
					埋込天井灯 (下面開放型) FRS2-20	材料費		外税		10.0%		154,000							
					《 月 計 》							143,000							
					《 業 者 計 》							14,300							
												157,300							
XX/10/31	218	1	K2002003-00	223 (株) 池太組	0020-0110-000600	外部足場	100.00	m2		1,900.0		190,000	19,000		(省略)				
					A3055BT	外注費		外税		10.0%		209,000							
					《 月 計 》							190,000							
					《 業 者 計 》							19,000							
												209,000							
XX/10/31	256	1	K2002003-00	224 (有) アイコーボレーション	0000-0887-000061	清掃・ゴミ	1.00	式		270,000.0		270,000	27,000		(省略)				
					清掃・ゴミ処理	外注費		外税		10.0%		297,000							
XX/10/31	256	2	K2002003-00	224 (有) アイコーボレーション	0000-0888-000062	リース機械	1.00	式		70,000.0		70,000	7,000		(省略)				
					レッカー	機械費		外税		10.0%		77,000							
					《 月 計 》							340,000							
					《 業 者 計 》							34,000							
												374,000							
												340,000							
												34,000							
												374,000							

税抜金額			消費税			税込金額				
	0%	8%	8%以下	10%	8%	8%以下	10%	8%	8%以下	10%
総合計				673,000			67,300			740,300
税率別合計	0	0	0	673,000	0	0	67,300	0	0	740,300

仕入集計表(業者別/工事別/要素別)

〈A 4 横〉

仕入伝票入力や日報入力で登録した原価データを業者別・工事別・要素別に集計できます。

Page. 1
20XX/11/15

仕入集計表(業者別)

原価指南株式会社
『表示順:業者(α→)順 昇順』『期間:XX/10/01～XX/10/31』『業者:111～最後』

業者	金額	消費税	税込金額	備考
111 吉田生コンクリート(株)	3,210,000	256,800	3,466,800	
115 (株)成和産業 北陸営業所	254,000	20,320	274,320	
116 (株)金五郎商店	3,101,500	248,120	3,349,620	
118 金沢地区生コンクリート協同組合	8,500	680	9,180	
119 (株)早田倉庫 金沢支店	658,400	52,672	711,072	
210 (株)光電気	143,000	14,300	157,300	

Page. 1
20XX/11/15

仕入集計表(工事別)

原価指南株式会社
『期間:XX/10/01～XX/10/31』『業者:111～最後』『立替先の表示:すべて表示する』

業者	工事	金額	消費税	税込金額	備考
111 吉田生コンクリート(株)	県道15号線道路改良工事	1,200,000	96,000	1,296,000	
111 吉田生コンクリート(株)	前川邸新築工事	10,000	800	10,800	
111 吉田生コンクリート(株)	第三高校増設工事	2,000,000	160,000	2,160,000	
《業者計》		3,210,000	256,800	3,466,800	
115 (株)成和産業 北陸営業所	前川邸新築工事	254,000	20,320	274,320	
《業者計》					
116 (株)金五郎商店					
《業者計》					
118 金沢地区生コンクリート協同組合					
《業者計》					
119 (株)早田倉庫 金沢支店					
《業者計》					
210 (株)光電気					
《業者計》					
223 (株)池太組					
《業者計》					
224 (有)アイコーポレーション					
《業者計》					
226 アサテック(株)					
《業者計》					
235 (有)シマダ工業					
《業者計》					

Page. 1
20XX/11/15

仕入集計表(要素別)

原価指南株式会社
『期間:XX/10/01～XX/10/31』『業者:111～最後』『立替先の表示:すべて表示する』

業者	工事	要素内訳	金額	消費税	税込金額
111 吉田生コンクリート(株)	《工事計》	D2001001-00 県道15号線道路改良工事	1,200,000	96,000	1,296,000
111 吉田生コンクリート(株)	《工事計》	K2002006-00 前川邸新築工事	1,200,000	96,000	1,296,000
111 吉田生コンクリート(株)	《工事計》	P0000003-00 第三高校増設工事	10,000	800	10,800
115 (株)成和産業 北陸営業所	《業者計》	K2002006-00 前川邸新築工事	24,000	1,920	25,920
115 (株)成和産業 北陸営業所	《工事計》	K2002006-00 前川邸新築工事	230,000	18,400	248,400
116 (株)金五郎商店	《業者計》	Z2009999-00 その他業務	254,000	20,320	274,320
116 (株)金五郎商店	《工事計》	Z2009999-00 その他業務	3,101,500	248,120	3,349,620
118 金沢地区生コンクリート協同組合	《業者計》	D2001001-00 県道15号線道路改良工事	8,500	680	9,180
118 金沢地区生コンクリート協同組合	《工事計》	D2001001-00 県道15号線道路改良工事	8,500	680	9,180
119 (株)早田倉庫 金沢支店	《業者計》	Z2009999-00 その他業務	658,400	52,672	711,072
119 (株)早田倉庫 金沢支店	《工事計》	Z2009999-00 その他業務	658,400	52,672	711,072
210 (株)光電気	《業者計》	V2004002-00 第一小学校2～3F電灯改修工事	143,000	14,300	157,300
210 (株)光電気	《工事計》	V2004002-00 第一小学校2～3F電灯改修工事	143,000	14,300	157,300
223 (株)池太組	《業者計》	K2002003-00 栗田邸新築工事	190,000	19,000	209,000
223 (株)池太組	《工事計》	K2002003-00 栗田邸新築工事	190,000	19,000	209,000
224 (有)アイコーポレーション	《業者計》	K2002003-00 栗田邸新築工事	70,000	7,000	77,000
224 (有)アイコーポレーション	《工事計》	K2002003-00 栗田邸新築工事	270,000	27,000	297,000
226 アサテック(株)	《業者計》	K2002001-00 中央駅南新築工事	1,365,000	136,500	1,501,500
226 アサテック(株)	《工事計》	K2002001-00 中央駅南新築工事	1,365,000	136,500	1,501,500

仕入明細集計・分析表

仕入伝票明細を上表の1つまたは複数の項目で集計できます。

〈フリー〉

集計範囲指定(絞り込み)項目		集計項目	
伝票日付		業者ごとに区別する／しない	
伝票番号		工事ごとに区別する／しない	
業者(業者コード範囲)		日付ごとに区別する／しない	
その他多数		仕入明細ごとに区別する／しない	
表示金額		要素、または要素内訳ごとに区別する／しない	
税抜(税抜額と消費税額)		借方科目、貸方科目、または両方の科目で区別する／しない	
税込(税込額のみ)		外税/内税/税無/消費税(消費税額調整明細)で区別する／しない	
		税率 (0～8%、8%(軽減)、10%) で区別する／しない	

【集計例1】
集計項目：工事・借方科目
表示金額：税抜

仕入明細集計・分析表

原価指南株式会社

工事		借方科目		借方税区分	税抜金額	消費税
No.						
1	D2001001-00	県道 1 5 号線道路改良工事	1212-0000	未成材料仕入高	8,500	680
2	K2002001-00	中央駅南新築工事	1212-0000	未成材料仕入高	1,706,600	163,828
3	K2002003-00	栗田邸新築工事	1231-0000	未成外注加工費	460,000	46,000
4	K2002003-00	栗田邸新築工事	1241-0000	未成機械等経費	70,000	7,000
5	K2002006-00	前川邸新築工事	1231-0000	未成外注加工費	230,000	18,400
6	K2002006-00	前川邸新築工事	1241-0000	未成機械等経費	24,000	1,920
7	V2004002-00	第一小学校2～3F電灯改修工事	1212-0000	未成材料仕入高	143,000	14,300
8	Z2009999-00	その他業務	1212-0000	未成材料仕入高	3,759,900	300,792

【集計例2】
集計項目：品名・業者
表示金額：税抜

仕入明細集計・分析表

原価指南株式会社

業者		品名/規格		数量	単位	税抜金額	消費税
No.							
1	000000115	(株) 成和産業 北陸営業所	0000-0999-009999	コンテナボックス設置	1.00 式	100,000	8,000
2	000000115	(株) 成和産業 北陸営業所	0000-0999-009999	用水 他一式	1.00 式	80,000	6,400
3	000000115	(株) 成和産業 北陸営業所	0000-0999-009999	簡易水洗トイレリース	1.00 式	50,000	4,000
4	000000115	(株) 成和産業 北陸営業所	0000-0999-009999	4 tユニック・5 tクレーン	1.00 式	24,000	1,920
5	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0201-000011	硬質塩化ビニール管	100.00 m	19,000	1,520
6	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0201-000033	硬質塩化ビニール管	100.00 m	12,000	960
7	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0201-000034	硬質塩化ビニール管	100.00 m	18,000	1,440
8	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0312-000101	下水道工事関係	50.00 個	75,000	6,000
9	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0312-000102	下水道工事関係	50.00 個	37,500	3,000
10	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0903-000080	衛生家具工事	1.00 式	945,000	75,600
11	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0903-000081	衛生家具工事	1.00 式	270,000	21,600
12	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0903-000082	衛生家具工事	1.00 式	675,000	54,000
13	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0904-000083	電気設備工事	1.00 式	800,000	64,000
14	000000116	(株) 金五郎商店	0000-0904-000084	電気設備工事	1.00 式	250,000	20,000
15	000000118	金沢地区生コンクリート協同組合	0000-0123-000001	相対度7コン(20)	1.00 t	8,500	680

支払伝票一覧表/支払明細一覧表

〈A 4 横〉

支払伝票入力の確認リストです。

原価指南株式会社									
『表示順:伝票番号順 昇順』『期間:XX/12/01~XX/12/31』『月別小計行:出力する』									
Page. 1 20XX/01/10									
支払伝票一覧表									
伝票日付	伝票番号	業者				金額	摘要		
XX/12/01	208	111	吉田生コンクリート (株)				3,466,800		
XX/12/01	209	115	(株) 成和産業 北陸営業所				274,320		
XX/12/01	210	116	(株) 金五郎商店				3,349,620		
XX/12/01	211	119	(株) 早田倉庫 金沢支店				711,072		
XX/12/01	212	210	(株) 光電気				154,440		
XX/12/01	213	223	(株) 池太組				205,200		
XX/12/01	214	224	(有) アイコーボレーション				367,200		
XX/12/01	215	226	アサテック (株)				1,474,200		
XX/12/01	216	235	(有) シマダ工業				368,928		
XX/12/31	217	111	吉田生コンクリート (株)				16,976,520		
XX/12/31	218	115	(株) 成和産業 北陸営業所				670,680		
XX/12/31	219	116	(株) 金五郎商店				4,624,840		
XX/12/31	220	211	中川組 (株)				320,040		
XX/12/31	221	215	清見建設 (株)				1,080,000		

原価指南株式会社									
『表示順:業者(コード)順 昇順』『期間:XX/12/01~XX/12/31』									
Page. 1 20XX/01/10									
支払明細一覧表									
日付 伝票番号	行	業者	伝票区分 要素内訳	金額	手形期日 手形番号	備考1 備考2	工事 工事別金額	工事別備考1 工事別備考2	
XX/12/31 231	1	243 富資源開発	22 振込 2211 振込(みずほ)	860,636					
XX/12/31 231	2	243 富資源開発	23 手数料 2321 手数料(みずほ)	864					
XX/12/31 231	3	243 富資源開発	32 協会費 3281 協会費	2,500					
《 月 計 》				864,000					
《 業者計 》				864,000					
XX/12/31 232	1	413 (株) レンタルドットコム	22 振込 2211 振込(みずほ)	37,368					
XX/12/31 232	2	413 (株) レンタルドットコム	23 手数料 2321 手数料(みずほ)	864					
《 月 計 》				38,232					
《 業者計 》				38,232					

仕入先ごとの仕入・支払明細及び残高が確認できます。業者締／社内締(決算日)2通りで集計できます。

〈A 4 横〉

Page. 1
20XX/06/15

仕入元帳

原価指南株式会社

『表示順:業者(コト)順 昇順』 『期間:XX/04~XX/05』 『業者:111~111』

[illegible]

売上传票一覧表/売上明細一覧表

〈A 4 横〉

工事ごとに売上传票入力した確認リストです。

売上传票一覧表

Page. 1
20XX/01/15

原価指南株式会社

『表示順:請求先順 昇順』『伝票日付:XX/11/01～XX/12/31』『出力対象:全』

伝票日付	伝票番号	請求先	工事	税抜金額	消費税	税込金額	摘要	請求番号
XX/11/30	101	東川建設 (株)	前田邸改築工事	200,000	16,000	216,000		581
XX/11/30	1010	東川建設 (株)	池田町役場前道路工事	7,500,000	600,000	8,100,000		581
《 月 計 》								
XX/12/31	102	東川建設 (株)	前田邸改築工事	200,000	16,000	216,000		548
XX/12/31	1011	東川建設 (株)	池田町役場前道路工事	7,500,000	600,000	8,100,000		548
《 月 計 》								
《 請 求 先 順 昇 順 》								
XX/12/29	1042							
XX/12/31	15							
《 月 計 》								
XX/12/31	7							
《 月 計 》								
XX/12/31	1053							
《 月 計 》								
XX/11/30	1044							
XX/11/30	1062							
《 月 計 》								
XX/12/31	1045							
XX/12/31	1063							
《 月 計 》								
XX/11/10	1052							
《 月 計 》								
XX/11/30	1056							
《 月 計 》								
XX/12/31	1057							
《 月 計 》								
《 総 計 》								

売上明細一覧表

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社

『表示順:請求先順 昇順』『伝票日付:XX/11/01～XX/11/30』

伝票日付	行	請求先	工事	品名	単位	税率	数量	税抜金額	消費税	税込金額	要素内訳	備考
XX/11/30	1	101	東川建設 (株)	0000-0099-0000003	工事代金	式	200,000.0	1.00	200,000	216,000	工事売上	
XX/11/30	1	K2002012-00	前田邸改築工事	工事代金	外税	8.0%			16,000			
XX/11/30	1	101	東川建設 (株)	0000-0099-0000003	工事代金	式	7,500,000.0	1.00	7,500,000	8,100,000	工事売上	
XX/11/30	1010	W2005002-00	池田町役場前道路工事	工事代金	外税	8.0%			600,000			
《 月 計 》												
《 請 求 先 計 》												
XX/11/30	1	112	ミツ開発 (株)	0000-0099-0000003	工事代金	式	200,000.0	1.00	200,000	216,000	工事売上	
XX/11/30	1044	V2004006-00	山田邸電気工事	工事代金	外税	8.0%			16,000			
XX/11/30	1	112	ミツ開発 (株)	0000-0099-0000003	工事代金	式	3,500,000.0	1.00	3,500,000	3,780,000	工事売上	
XX/11/30	1062	V2004003-00	町医館給排水設備工事	工事代金	外税	8.0%			280,000			
《 月 計 》												
《 請 求 先 計 》												
XX/11/10	1	113	(株) 吉田組開発	0000-0099-0000003	工事代金	式	750,000.0	1.00	750,000	825,000	工事売上	
XX/11/10	1052	V2004002-00	第一小学校～町医館改築工事	工事代金	外税	10.0%			75,000			
《 月 計 》												
《 請 求 先 計 》												
XX/11/30	1	1021	木村不動産 (株)	0000-0099-0000003	工事代金	式	7,000,000.0	1.00	7,000,000	7,700,000	工事売上	
XX/11/30	1056	K2002001-00	中央駅南新築工事	工事代金	外税	10.0%			700,000			
《 月 計 》												
《 請 求 先 計 》												
《 月 計 》												
《 請 求 先 計 》												

税抜金額			消費税			税込金額		
0%	8%	10%	8%	10%	0%	8%	10%	
総合計			19,150,000			1,687,000		
税別合計			0			12,312,000		

〈A 4 横〉

Page. 1
20XX/05/10Page. 1
20XX/04/10

入金明細一覽表

Page. 1
20XX/04/10

受取手形明細表

原価指南株式会社

『表示順:請求先(ユート)順 昇順』『未成・完成:両方』

[illegible]Page. 1
20XX/05/10

〈A 4 横〉

〒 231-0854

神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

受領書

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

105

工事No./日付	伝票No.	項目名 / 品名	数量	単位	税率	受領印
Z2009003-00	1064	物販売上				受領日 年 月 日 受領印
XX/02/25		鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	10.0%	
XX/02/25		U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	10.0%	

〒 231-0854

神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

納品書

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

105

工事No./日付	伝票No.	項目名 / 品名	数量	単位	税率	単価	金額
Z2009003-00	1064	物販売上					
XX/02/25		鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	10.0%	128,000.0	1,280,000
XX/02/25		U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	10.0%	89,000.0	445,000

0 消費税

725,000 消費税

172,500

税抜金額	1,725,000
消費税	172,500
合計	1,897,500

Page. 3

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400 みずほ銀行東京営業部
FAX 076-225-8407 (当座) 12345678
登録番号 T8700110005901

工事No./日付	伝票No.	項 目 名 / 品 名	数 量	単 位	税 率	単 価	金 額
Z2009003-00	1064	物販売上					
XX/02/25		鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	10.0%	128,000.0	1,280,000
XX/02/25		U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	10.0%	89,000.0	445,000

			税抜金額	1,725,000
0	消費税	0	消費税	172,500
725,000	消費税	172,500	合 計	1,897,500

Page. 2

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400 みずほ銀行東京営業部
FAX 076-225-8407 (当座) 12345678
登録番号 T8700110005901

工事No./日付	伝票No.	項目名/品名	数量	単位	税率	単価	金額
Z2009003-00	1064	物販売上					
XX/02/25		鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	10.0%	128,000.0	1,280,000
XX/02/25		U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	10.0%	89,000.0	445,000

Page. 1

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジースサイドビル
TEL 076-225-8400 みずほ銀行東京営業部
FAX 076-225-8407 (当座) 12345678
登録番号 T8700110005901

工事№/日付	伝票№	項目名 / 品名	数量	単位	税率	単価	金額
Z2009003-00	1064	物販売上					
XX/02/25		鉄筋コンクリート型側溝	10.00	個	10.0%	128,000.0	1,280,000
XX/02/25		U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	10.0%	89,000.0	445,000

毎度お引き立てありがとうございます。上記の通りご請求申し上げます。	8%軽減 税抜	0	消費税	0	税抜金額	1,725,000
	8.0% 税抜	0	消費税	0	消費税	172,500
	10.0% 税抜	1,725,000	消費税	172,500	合 計	1,897,500

請求書(請求先別/工事別)

〈A 4 横〉

全ての明細が一括で表示される一括請求タイプ(上)と、合計請求+請求内訳(工事別)タイプ(下)があります。

〒 231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳
1,725,000	0	172,500
4,000,000	0	320,000
0	0	0
今回売上額	今回調整額	消費税等
5,725,000	0	492,500
今回ご請求額 6,217,500		

№/日付	伝票番号	工 事 名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金 額	税 率	備 考
D2001001-00	1	平成 X X 年度地域総合整備事業 県土幹線 1 5 号線道路改良工事						
XX/10/30	1	工事代金 ※経過措置適用工事	1.00	式	4,000,000.0	4,000,000	8.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 4,000,000		
						(消費税) 320,000		
Z2009003-00	1064	物販売上						
XX/10/31	1064	鉄筋コンクリートU型側溝	10.00	個	128,000.0	1,280,000	10.0%	
XX/10/31	1064	U型側溝(自由勾配型)	5.00	個	89,000.0	445,000	10.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 1,725,000		
						(消費税) 172,500		

〒 231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳
1,725,000	0	172,500
4,000,000	0	320,000
0	0	0
今回売上額	今回調整額	消費税等
5,725,000	0	492,500
今回ご請求額 6,217,500		

№/日付	項目名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金額(税込)	税 率	備 考
D2001001-00	平成 X X 年度地域総合整備事業 県土幹線 1 5 号線道路改良工事				4,320,000		
Z2009003-00	物販売上				1,897,500		

〒 231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳
0	0	0
4,000,000	0	320,000
0	0	0
今回売上額	今回調整額	消費税等
4,000,000	0	320,000
今回ご請求額 4,320,000		

工 事 名	平成 X X 年度地域総合整備事業 県土幹線 1 5 号線道路改良工事							
№/日付	伝票番号	項目名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金額	税 率	備 考
D2001001-00	1	工事代金 ※経過措置適用工事	1.00	式	4,000,000.0	4,000,000	8.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 4,000,000		
						(消費税) 320,000		

〒 231-0854
神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7

株式会社横浜土木

御中

原価指南株式会社
〒 920-8203 石川県金沢市鞍月4丁目115番地
金沢ジーサイドビル
TEL 076-225-8400
FAX 076-225-8407
登録番号 T8700110005901

みずほ銀行東京営業部
(当座) 12345678

105

売上額内訳	調整額内訳	消費税内訳
0	0	0
4,000,000	0	320,000
0	0	0
今回売上額	今回調整額	消費税等
4,000,000	0	320,000
今回ご請求額 4,320,000		

工 事 名	平成 X X 年度地域総合整備事業 県土幹線 1 5 号線道路改良工事							
№/日付	伝票番号	項目名 / 品 名	数 量	単 位	単 価	金額	税 率	備 考
D2001001-00	1	工事代金 ※経過措置適用工事	1.00	式	4,000,000.0	4,000,000	8.0%	
		《 工 事 計 》				(税抜) 4,000,000		
						(消費税) 320,000		

請求一覧表(請求先別/工事別/回収予定日別)

〈A 4 横〉

繰越残高及び当月の請求額が請求先別・工事別・回収予定日別に確認できます。

請求一覧表(請求先別)

請求先											
請求先		区分	請求開始日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額	今回請求額	
101 東川建設 (株)	101	同業者	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額	今回請求額
		31日	XX/11/30	XX/11/01	0	0	7,700,000	0	770,000	8,470,000	8,470,000
103 佐賀市役所土木課	103	市町村	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額	今回請求額
		31日	XX/11/30	XX/11/01	7,560,000	0	0	0	0	0	0
105 (株) 横浜土木	105	元請先	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額	今回請求額
		31日	XX/11/30	XX/11/01	5,832,000	5,832,000	0	0	0	0	5,832,000

請求一覧表(工事別)

工事											
工事		営業担当	区分	請求開始	回収	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額
K2002012-00 前田邸改築工事	101 東川建設 (株)	林 健二	同業者	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額
			31日	XX/11/30	XX/12/31	0	0	200,000	0	20,000	220,000
W2005002-00 池田町役場前道路工事	101 東川建設 (株)	林 健二	同業者	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額
			31日	XX/11/30	XX/12/31	0	0	7,500,000	0	750,000	8,250,000
《 請求先計 》	《 請求先計 》	小川 慎一郎	市町村	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額
			31日	XX/11/30	XX/12/31	7,560,000	0	7,700,000	0	770,000	8,470,000
V2004001-00 慶秀大教育学部改修仮設電気工事	103 佐賀市役所土木課	岩田 敦	同業者	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額
			31日	XX/11/30	XX/12/31	7,560,000	0	0	0	0	0
S2003003-02 横浜市中区天池町維持修繕工事 (追) 杉山 雅博	《 請求先計 》	元請先	縮日	請求終了日	前回収請求額	繰越残高	今回売上税抜額	今回売上値引額	今回消費税	今回売上総額	今回請求額
			31日	XX/11/30	XX/11/01	432,000	0	0	0	0	0

請求一覧表(回収予定日別)

『期間:XX/11/01～XX/11/30』『今回売上0円:出力する』『今回請求0円:出力しない』											
回収予定日	請求先	区分 縮日	請求開始日 請求終了日	前回送請求額 今回入金金額	繰越残高	今回 売上税抜額	今回 売上値引額	今回 消費税	今回 売上総額	今回 請求額	
XX/12/31	101 東川建設（株）	同業者 31日	XX/11/01 XX/11/30	0 0	0	7,700,000	0	770,000	8,470,000	8,470,000	
XX/12/31	105（株）横浜土木	元請先 31日	XX/11/01 XX/11/30	5,832,000 0	5,832,000	0	0	0	0	5,832,000	
XX/12/31	112 ミワ開発（株）	同業者 31日	XX/11/01 XX/11/30	3,240,000 3,240,000	0	3,500,000	0	350,000	3,850,000	3,850,000	
				9,072,000							
	《 回収予定日計 》			3,240,000	5,832,000	11,200,000	0	1,120,000	12,320,000	18,152,000	

繰越残高及び当月の請求額が営業担当別・営業担当工事別に確認できます。

原価指南株式会社

請求一覧表(営業担当者別)

Page. 1
20XX/12/10

営業担当者	請求開始日 請求終了日	前回請求額 今回入金金額	繰越残高	今回 売上税抜額	今回 売上値引額	今回 消費税	今回 売上総額	今回 請求額
102 林 健二	XX/11/01 XX/11/30	19,224,000 13,824,000	5,400,000	7,700,000	0	770,000	8,470,000	13,870,000
103 杉山 雅博	XX/11/01 XX/11/30	432,000 0	432,000	0	0	0	0	432,000
201 小川 慎一郎	XX/11/01 XX/11/30	10,800,000 10,800,000	0	3,500,000	0	350,000	3,850,000	3,850,000

原価指南株式会社

請求一覧表(工事別)

Page. 1
20XX/12/10

工事 請求先	営業担当 現場代理人	区分 締日	請求開始 ・終了日	回収 予定日	前回請求額 今回入金金額	繰越残高	今回 売上税抜額	今回 売上値引額	今回 消費税	今回 売上総額	今回 請求額
K2002012-00 前田邸改築工事 101 東川建設(株)	林 健二 田中 博	同業者 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	0 0	0	200,000	0	20,000	220,000	220,000
W2005002-00 池田町役場前道路工事 101 東川建設(株)	林 健二 後藤 清	同業者 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	0 0	0	7,500,000	0	750,000	8,250,000	8,250,000
W2005001-00 国道2号線道路改良工事 105 (株) 横浜土木	林 健二 柴田 久雄	元請先 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	5,400,000 0	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000
K2002003-00 栗田邸新築工事 107 栗田 吾郎	林 健二 加藤 健一	一般民間 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	13,824,000 13,824,000	0	0	0	0	0	0
《 営業担当者計 》					19,224,000 13,824,000	5,400,000	7,700,000	0	770,000	8,470,000	13,870,000
S2003003-02 横浜市中区天池町維持修繕工事(追)杉山 雅博 105 (株) 横浜土木	柴田 久雄	元請先 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	432,000 0	432,000	0	0	0	0	432,000
《 営業担当者計 》					432,000 0	432,000	0	0	0	0	432,000
V2004001-00 優秀大教育学部改修仮設電気工事 103 佐賀市役所土木課	小川 慎一郎 岩田 敦	市町村 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	7,560,000 7,560,000	0	0	0	0	0	0
V2004003-00 県医師会共同ビル新築工事 112 ミワ開発(株)	小川 慎一郎 岩田 敦	同業者 31日	XX/11/01 XX/11/30	XX/12/31	3,240,000 3,240,000	0	3,500,000	0	350,000	3,850,000	3,850,000
《 営業担当者計 》					10,800,000 10,800,000	0	3,500,000	0	350,000	3,850,000	3,850,000

〈A 4 横〉

Page. 1
20XX/11/10

『表示順:発注者順 昇順』『期間:XX/10~XX/10』『売上区分:売上額』

[illegible]Page. 1
20XX/11/10

『期間:1XX/10~XX/10』 『発注者:最初~112』 『売上区分:売上額』

[illegible]

工事回収管理表（回収予定/回収実績）

〈A 4 横〉

工事登録に入力された回収(入金)予定と入金伝票により、未集金状況・今後の入金予定・入金実績内訳を金種別に確認することができます。

Page. 3
20XX/07/10

工事回収管理表 [回収予定]

部門	発注者 工事 実施工期		発注者区分 営業担当者 完成日	請負金額 入金済金額 未収金額	入金予定額（上段：現金・振込等、中段：手形、下段：合計）					
					XX/01	XX/02	XX/03	XX/04	XX/05	XX/06
2	建設部	113 (株) 吉田組開発 K2002005-00 吉田邸新築工事 ～	元請先 後藤 清 XX/01/31	25,920,000 12,960,000 12,960,000	0	11,700,000	0	0	0	0
		113 (株) 吉田組開発 Y2004002-00 第一小学校2～3F電灯改修工事 XX/10/25 ～ XX/11/07	元請先 小川 慎一郎	810,000 810,000 0	0	0	0	0	0	0
3	設備部	113 (株) 吉田組開発 Y0050309-00 金沢産業 給排水衛生設備工事 ～	元請先	1,563,527 1,563,527 0	0	0	0	0	0	0
		《 発注者計 》			0	11,700,000	0	0	0	0
99	本社	114 佐伯町役場 Y0085001-00 佐伯町庁舎新築工事 ～	市町村 鈴木 慎一郎	28,829,520 0 28,829,520	0	0	0	0	0	0
		《 発注者計 》			0	0	0	0	0	0

Page. 3
20XX/07/10

工事回収管理表 [回収実績]

部門	発注者 工事 実施工期		完成日 営業担当者 発注者区分	請負金額 入金済金額 未収金額	上段：現金・振込等、中段：手形、下段：合計		未収金当月残
					入金予定額	入金実績額	
5	舗装部	105 (株) 横浜土木 W2005001-00 国道2号緑道路改良工事 XX/10/01 ～ XX/01/19	XX/02/10 林 健二 元請先	39,960,000 5,400,000 34,560,000	37,800,000 0 37,800,000	32,400,000 0 32,400,000	0 0 2,160,000
		101 東川建設 (株) W2005002-00 池田町役場前道路路工事 XX/11/01 ～ XX/12/20	XX/12/31 林 健二 同業者	16,200,000 8,316,000 7,884,000	15,750,000 0 15,750,000	7,884,000 0 7,884,000	0 0 0
99	本社	《 部門計 》		56,160,000 13,716,000 42,444,000	53,550,000 0 53,550,000	40,284,000 0 40,284,000	2,160,000 0 2,160,000
		114 佐伯町役場 Y0085001-00 佐伯町庁舎新築工事 ～	鈴木 慎一郎 市町村	28,829,520 0 28,829,520	0 0 0	0 0 0	0 0 28,829,520
99	本社	103 佐賀市役所土木課 Y0088000-00 佐賀市役所改築工事 (全体分) ～	鈴木 慎一郎 市町村	27,000,000 0 27,000,000	0 0 0	0 0 0	0 0 27,000,000
		103 佐賀市役所土木課 Y0088000-01 佐賀市役所改築工事 (自社分) ～	鈴木 慎一郎 市町村	18,900,000 0 18,900,000	0 0 0	0 0 0	0 0 18,900,000
99	本社	《 部門計 》		74,729,520 0 74,729,520	0 0 0	0 0 0	0 0 74,729,520
		《 部門計 》		74,729,520 0 74,729,520	0 0 0	0 0 0	0 0 74,729,520

売上・入金状況を 6 ヶ月間の推移で確認でき、未収金の確認が行なえます。発注者別・工事別・請求先別で集計できます。

売上入金推移表 6 ヶ月 (発注者別)											
原価指南株式会社											
『表示順:発注者(コード)順 昇順』『期間:XX/01~XX/06』『締日の選択:マスター締日』											
上段:売上税込金額/下段:入金額											
20XX/07/10											
Page. 1											
発注者	前月まで	XX年1月	XX年2月	XX年3月	XX年4月	XX年5月	XX年6月	6ヶ月合計	累計		
101 東川建設 (株)	16,632,000	216,000	0	0	3,996,000	2,740,500	2,740,500	9,693,000	26,325,000		
	8,532,000	8,100,000	216,000	0	0	3,996,000	2,740,500	15,052,500	23,584,500		
103 佐賀市役所土木課	7,560,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	8,640,000		
	7,560,000	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	8,640,000		
104 北秋田市土木事務所	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105 (株) 横浜土木	25,812,000	0	25,920,000	12,960,000	0	5,400,000	0	44,280,000	70,092,000		
	5,832,000	0	0	25,920,000	10,800,000	0	5,400,000	62,100,000	67,932,000		
107 栗田 吾郎	19,224,000	0	0	7,776,000	0	0	0	7,776,000	27,000,000		
	13,824,000	5,400,000	0	0	7,776,000	0	0	13,176,000	27,000,000		
108 新見市長	8,640,000	0	0	0	0	0	0	0	8,640,000		
	0	8,640,000	0	0	0	0	0	8,640,000	8,640,000		
112	18,468,000	216,000	216,000	0	0	0	0	432,000	18,900,000		

売上入金推移表 6 ヶ月 (工事別)											
原価指南株式会社											
『期間:XX/01~XX/06』『発注者:最初~107』『締日の選択:マスター締日』											
上段:売上税込金額/下段:入金額											
20XX/07/10											
Page. 1											
発注者工事	前月まで	XX年1月	XX年2月	XX年3月	XX年4月	XX年5月	XX年6月	6ヶ月合計	累計		
101 東川建設 (株)	0	0	0	0	3,996,000	2,740,500	2,740,500	9,477,000	9,477,000		
D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	0	0	0	0	0	3,996,000	2,740,500	6,736,500	6,736,500		
101 東川建設 (株)	432,000	216,000	0	0	0	0	0	216,000	648,000		
K2002012-00 前田邸改築工事	216,000	216,000	216,000	0	0	0	0	432,000	648,000		
101 東川建設 (株)	16,200,000	0	0	0	0	0	0	0	16,200,000		
W2005002-00 池田町役場前道路工事	8,316,000	7,884,000	0	0	0	0	0	7,884,000	16,200,000		
《 発注者計 》	16,632,000	216,000	0	0	3,996,000	2,740,500	2,740,500	9,693,000	26,325,000		
	8,532,000	8,100,000	216,000	0	0	3,996,000	2,740,500	15,052,500	23,584,500		
103 佐賀市役所土木課	7,560,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	8,640,000		
V2004001-00 優秀大教育学部改修仮設電気工	7,560,000	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	8,640,000		
《 発注者計 》	7,560,000	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	8,640,000		
	7,560,000	0	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	8,640,000		
104 北秋田市土木事務所	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K2002002-00 池田町多目的ホール工事	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
《 発注者計 》	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105 (株) 横浜土木	0	0	4,320,000	10,800,000	0	5,400,000	0	20,520,000	20,520,000		
D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	0	0	0	4,320,000	10,800,000	0	5,400,000	20,520,000	20,520,000		
105 (株) 横浜土木	9,180,000	0	0	0	0	0	0	0	9,180,000		
S2003003-01 横浜市中区天池町維持修繕工事	0	9,180,000	0	0	0	0	0	9,180,000	9,180,000		
105 (株) 横浜土木	16,200,000	0	21,600,000	2,160,000	0	0	0	23,760,000	39,960,000		

売上傳票明細を上表の1つまたは複数の項目で集計できます。

【集計例 1】

集計項目：請求先・工事
表示金額：税抜

集計範囲指定(絞り込み)項目	集計項目
伝票日付	業者ごとに区別する／しない
伝票番号	工事ごとに区別する／しない
請求先(コード範囲)	日付ごとに区別する／しない
その他多数	品名 仕入明細ごとに区別する／しない
	要素 要素内訳ごとに区別する／しない
表示金額	科目 借方科目、貸方科目、または両方の科目で区別する／しない
税抜(税抜額と消費税額)	税処理 外税/内税/税無/消費税/消費税額調整(明細)で区別する／しない
税込(税込額のみ)	税率 税率 (0%～8%、8%(軽減)、10%) で区別する／しない

[illegible]

集計例 2】
集計項目：請求先・工事・品名
表示金額：税抜

[illegible]

売上・入金・発生原価の状況を6カ月または12ヶ月の推移で確認できます。売上と原価とのバランスを見ながら業者への支払調整などに利用できます。限界利益とのバランスも確認できます。

Page. 1
20XX/10/10

売上仕入分析表

原価指南株式会社

『期間:XX/10~XX/09』『未成・完成:両方』『工事:D2001001-00~D2001001-00』

工事コード 発注者 契約工期 工事場所	D2001001-00 (株) 横浜土木 XX/10/06 ~ XX/01/31 横浜市都筑区矢吹地内	工事 県道 1 5 号線道路改良工事		部門 営業担当者 現場代理人		土木部 鈴木 慎一郎 林 健二		請負金額 消費税 請負合計		39,000,000 3,120,000 42,120,000	
		前月残高	XX/10	XX/11	XX/12	XX/01	XX/02	XX/03	合計		
売上額	0		0	0	0	0	4,000,000	10,000,000	39,000,000		
消費税	0		0	0	0	0	320,000	800,000	3,120,000		
現金	0		0	0	0	0	0	0	0		
振込	0		0	0	0	0	0	0	0		
手数料	0		0	0	0	0	0	4,320,000	17,520,000		
手形	0		0	0	0	0	0	0	0		
入 金	0		0	0	0	0	0	0	3,000,000		
その他	0		0	0	0	0	0	0	0		
内 相殺	0		0	0	0	0	0	0	0		
協 会 費	0		0	0	0	0	0	0	0		
協 会 費 2	0		0	0	0	0	0	0	0		
値 引	0		0	0	0	0	0	0	0		
その他	0		0	0	0	0	0	0	0		
入金合計	0		0	0	0	0	0	4,320,000	20,520,000		
未収金	0		0	0	0	0	4,320,000	6,480,000	21,600,000		

	前月残高	XX/10	XX/11	XX/12	XX/01	XX/02	XX/03	合計	予算
材料費	0	8,500	15,219,000	13,815	0	0	0	15,241,315	15,244,220
仮設機械	0	668,000	275,600	6,907	0	0	0	950,507	1,473,400
外注費	0	0	4,997,000	41,444	0	0	0	5,038,444	4,997,000
直接経費	0	0	0	4,144	0	0	0	4,144	2,032,000
給与等	0	0	0	2,763	0	0	0	2,763	0
諸経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
変動費合計	0	676,500	20,491,600	69,073	0	0	0	21,237,173	23,746,620
							限界利益	17,762,827	
							限界利益率	45.55%	
労務費	0	327,520	629,680	13,815	0	0	0	971,015	3,767,750
固定費合計	0	327,520	629,680	13,815	0	0	0	971,015	3,767,750
仕入合計	0	1,004,020	21,121,280	82,888	0	0	0	22,208,188	27,514,370
							粗利益	16,791,812	
							粗利益率	43.06%	

原価配賦チェックリスト

〈A 4 縦〉

共通費を設定した基準で各工事に配賦することができます。その際の配賦処理結果が確認できます。

原価配賦チェックリスト

税抜

Page. 1

原価指南株式会社

20XX/01/10

『配賦基準:2』 『配賦元期間:XX/12/01~XX/12/31』 『未成・完成:両方』

配賦元工事	Z2009901-00	共通配賦用
配賦業者	9903	配賦業者

配賦日付	配賦先工事名	要素内訳	配賦率	金額
XX/12/31	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	材料費	2.30	13,815
XX/12/31	D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	材料費	0.82	4,920
XX/12/31	K2002001-00 中央駅南新築工事	材料費	0.45	2,692
XX/12/31	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	材料費	6.78	40,756
XX/12/31	K2002003-00 栗田邸新築工事	材料費	0.97	5,835
XX/12/31	K2002004-00 帝王ビル新築工事	材料費	0.06	368
XX/12/31	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	労務費	2.30	13,815
XX/12/31	D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	労務費	0.82	4,920
XX/12/31	K2002001-00 中央駅南新築工事	労務費	0.45	2,692
XX/12/31	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	労務費	6.79	40,756
XX/12/31	K2002003-00 栗田邸新築工事	労務費	0.97	5,835
XX/12/31	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	機械費	1.15	6,907
XX/12/31	D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	機械費	0.41	2,460
XX/12/31	K2002001-00 中央駅南新築工事	機械費	0.22	1,346
XX/12/31	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	機械費	3.40	20,378
XX/12/31	K2002003-00 栗田邸新築工事	機械費	0.49	2,918
XX/12/31	K2002004-00 帝王ビル新築工事	機械費	0.03	184
XX/12/31	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	外注費	6.91	41,444
XX/12/31	D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	外注費	2.46	14,761
XX/12/31	K2002001-00 中央駅南新築工事	外注費	1.35	8,076
XX/12/31	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	外注費	20.38	122,270
XX/12/31	K2002003-00 栗田邸新築工事	外注費	2.92	17,505
XX/12/31	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	直接経費	0.69	4,144
XX/12/31	D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	直接経費	0.25	1,476
XX/12/31	K2002001-00 中央駅南新築工事	直接経費	0.13	808
XX/12/31	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	直接経費	2.04	12,227
XX/12/31	K2002003-00 栗田邸新築工事	直接経費	0.29	1,751
XX/12/31	K2002004-00 帝王ビル新築工事	直接経費	0.02	110
XX/12/31	D2001001-00 県道 1 5 号線道路改良工事	その他	0.46	2,763
XX/12/31	D2001002-00 豊頃川改修護岸 2 工区	その他	0.16	984
XX/12/31	K2002001-00 中央駅南新築工事	その他	0.09	538
XX/12/31	K2002002-00 池田町多目的ホール工事	その他	1.36	8,152
XX/12/31	K2002003-00 栗田邸新築工事	その他	0.19	1,167
XX/12/31	K2002004-00 帝王ビル新築工事	その他	0.01	74
《 総 合 計 》				600,000

工事別原価管理表(実行予算管理/工事番号順)

〈A 3 横〉

工事別に請負額・実行予算・発生原価・利益・売上請求・入金の状況が一覧で確認できます。

Page. 1
20XX/01/10

税抜

工事別原価管理表

原価指南株式会社
『表示順:発注者順 昇順』『期間:XX/12/01～XX/12/31』『税選択:税抜』
『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	受注日 発注開始日	完成日 実施終了日	今回請負金額 累計請負金額	実行予算額 一般管理費	目標利益 目標利益率	目標純利益 目標純利益率	今回原価金額 累計原価金額	予算残高 消化率	実質利益 利益率
D2001002-00 豊川川改修護岸2工区 101 東川建設 (株)	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 柴田 久雄	XX/09/20 XX/10/01	XX/06/20 XX/06/20	0 24,000,000	15,925,342 1,200,000	8,074,658 33.64%	6,874,658 28.64%	461,961 461,961	15,463,381 2.90%	23,538,039 98.08%
K2002006-00 前川邸新築工事 その他	建築部 その他	山口 明夫	XX/10/07		0	20,702,810	3,297,190	3,297,190	2,358	20,236,452	23,533,642
K2002012-00 前田邸改築工事 101 東川建設 (株)	建築部 その他	林 健二 田中 博	XX/10/01 XX/10/01	XX/11/30 XX/11/30	24,000,000 600,000	13,74%	0	13.74%	466,358	2.25%	98.06%
《 発注者計 》											
K2002002-00 池田町多目的ホール工事 104 北秋田市土木事務所	建築部 官公庁発注工事	加藤 健一 林 健二	XX/09/15 XX/10/22	XX/10/30	48,600,000 100,000,000	36,628,152 5,000,000	11,971,848 21.60%	10,729,848 16.60%	464,319 244,539	35,699,833 78,151,461	47,671,681 99,755,461

工事別原価管理表

税抜

Page. 1
20XX/01/10

原価指南株式会社
『表示順:部門順 昇順』『期間:XX/12/01～XX/12/31』『税選択:税抜』
『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』

工事 発注者	部門 受注区分	営業担当者 現場代理人	受注日 発注開始日	完成日 実施終了日	今回請負金額 累計請負金額	実行予算額 一般管理費	目標利益 目標利益率	目標純利益 目標純利益率	今回原価金額 累計原価金額	予算残高 消化率	実質利益 利益率
D2001001-00 県道15号線道路改良工事 105 (株) 横底土木	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 水谷 智子	XX/10/06 XX/10/06	XX/03/31 XX/05/20	0 39,000,000	27,514,370 4,680,000	11,485,630 29.45%	6,805,630 17.45%	82,888 22,208,188	5,306,182 80.71%	16,791,812 43.06%
D2001002-00 豊川川改修護岸2工区 101 東川建設 (株)	土木部 官庁下請工事	鈴木 慎一郎 柴田 久雄	XX/09/20 XX/10/01	XX/06/20	0 24,000,000	15,925,342 1,200,000	8,074,658 33.64%	6,874,658 28.64%	461,961 461,961	15,463,381 2.90%	23,538,039 98.08%
《 部門計 》											
K2002001-00 中央駅南新築工事 1021 木村不動産 (株)	建築部 民間元請工事	沢井 茂喜 奥村 健一	XX/09/25 XX/10/01	XX/03/31 XX/02/26	0 51,000,000	28,414,050 6,120,000	22,585,950 44.29%	16,465,950 16.604,000	16,152 244,539	23,908,798 78,151,461	46,494,748 99,755,461
K2002002-00 池田町多目的ホール工事 104 北秋田市土木事務所	建築部 官公庁発注工事	加藤 健一 林 健二	XX/03/15 XX/10/22	XX/10/30	0 100,000,000	78,396,000 5,000,000	21,604,000 21.60%	16,604,000 16.60%	244,539	0.31%	99.78%
K2002003-00 栗田邸新築工事 107 栗田 吾郎	建築部 民間元請工事	林 健二 加藤 健一	XX/09/22 XX/10/05	XX/03/31	0 25,000,000	19,495,050 3,000,000	5,504,950 22.02%	2,504,950 10.02%	3,215,011 7,175,061	12,319,989 36.80%	17,824,939 71.30%

工事別原価管理表

Page. 1
20XX/11/10
原価指南株式会社

『表示順:工事順 昇順』『期間:XX/10/01～XX/10/31』『税選択:税抜』
『売上区分:受注額』『累計額対象:総累計』
『金額/残高表示:すべて0円開始は表示しない』『売上対象:あり (請求かつ売上)』

工 注 文 名	営業担当者 現場代理人	受注日 発注開始日	完成日 実施終了日	今回売上金額 累計売上金額	今回請負金額 累計請負金額	入金額 未収入金	請負一原価 利益率	原価合計	材料費	労務費	外注費	直接経費	経費1	経費2
D2001001-00 県道15号線道路改良工事 105 (株) 横底土木	鈴木 慎一郎 水谷 智子	XX/10/06 XX/10/06	XX/03/31 XX/05/20	0 34,000,000	34,000,000	0 34,000,000	0 97.03%	1,004,020	8,500	327,520	0	668,000	0	0
D2001002-00 豊川川改修護岸2工区 101 東川建設 (株)	鈴木 慎一郎 柴田 久雄	XX/09/20 XX/10/01	XX/06/30 XX/06/20	0 24,000,000	24,000,000	0 24,000,000	0 100.00%	0	0	0	0	0	0	0
K2002001-00 中央駅南新築工事 1021 木村不動産 (株)	沢井 茂喜 奥村 健一	XX/09/25 XX/10/01	XX/03/31 XX/02/26	5,000,000 5,000,000	1,000,000 51,000,000	1,706,600 1,706,600	49,293,400 96.63%	1,706,600	1,706,600	0	0	0	0	0
K2002002-00 池田町多目的ホール工事 104 北秋田市土木事務所	加藤 健一 林 健二	XX/10/14 XX/10/22	XX/02/26 XX/10/30	0 60,000,000	60,000,000	0 60,000,000	0 100.00%	0	0	0	0	0	0	0
K2002003-00 栗田邸新築工事 107 栗田 吾郎	林 健二 加藤 健一	XX/09/22 XX/10/05	XX/03/31 XX/03/31	12,800,000 12,800,000	0 25,000,000	530,000 530,000	24,470,000 97.88%	530,000	0	0	530,000	0	0	0
K2002004-00 帝王ビル新築工事 1021 木村不動産 (株)	杉山 雅博 西川 謙二	XX/10/05 XX/10/05	XX/05/31 XX/05/31	0 18,000,000	18,000,000	0 18,000,000	0 100.00%	0	0	0	0	0	0	0
K2002005-00 吉田邸新築工事 113 (株) 吉田組建築	後藤 清 杉山 雅博	XX/09/26 XX/10/01	XX/01/31	12,000,000 12,000,000	0 24,000,000	0 24,000,000	0 100.00%	0	0	0	0	0	0	0
K2002006-00 前川邸新築工事 101 東川建設 (株)	山口 明夫	XX/10/07		23,736,000 24,000,000	264,000 24,000,000	10,000 10,000	23,736,000 98.90%	264,000	10,000	0	254,000	0	0	0
K2002012-00 前田邸改築工事 101 東川建設 (株)	林 健二	XX/11/30		600,000 600,000	600,000	0	600,000 100.00%	0	0	0	254,000	0	0	0
	田中 博	XX/11/30		0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

〈A 3 横〉

原価指南株式会社

『期間:XX/10/01～XX/10/31』『税選択:税抜』『発注者:最初～1093』『金額/残高表示:すべて0円明細は表示しない』『売上区分:受注額』

[illegible]Page. 1
20XX/11/10

左：今回金額／右：累計金額

発注者	請負金額 上段：税抜／中段：消費税／下段：税込	売上金額	入金額 請負－入金	原価金額		材料費 労務費 外注費	直接経費 経費 1 経費 2	経費 3 経費 4
				請負－原価	利益率			
101 東川建設 (株) 4 同業者	39,600,000	428,600,000	0	10,944,000	108,384,000	2,010,000	23,010,000	0
	3,960,000	41,460,000	0		320,216,000	8,680,000	85,120,000	0
	43,560,000	470,060,000	0		74.71%	254,000	254,000	0
102 長野土木総合事務所 1 官公庁	0	265,000,000	0	0	0	0	0	0
	0	26,500,000	0		265,000,000	0	0	0
103 佐賀市役所土木課 2 市町村	0	291,500,000	0		100.00%	0	0	0
	50,500,000	300,500,000	7,000,000	0	0	0	0	0
	5,050,000	30,050,000	700,000	330,550,000	300,500,000	0	0	0
104 北秋田市土木事務所 1 官公庁	55,550,000	330,550,000	7,700,000		100.00%	0	0	0
	60,000,000	235,000,000	0	0	0	0	0	0
	6,000,000	23,500,000	0	258,500,000	235,000,000	0	0	0
105 (株) 柳莊土木 3 元請先	66,000,000	258,500,000	0		100.00%	0	0	0
	72,900,000	447,900,000	5,400,000	0	1,032,820	8,500	8,500	0
	7,290,000	44,790,000	540,000	492,690,000	446,867,180	356,320	356,320	0
106 松原開発会社 3 元請先	80,190,000	492,690,000	5,940,000		99.77%	0	0	0
	3,780,000	388,780,000	1,200,000	0	0	0	0	0
	378,000	38,878,000	120,000	427,658,000	388,780,000	0	0	0
107 栗田 吾郎 6 一般民間	4,158,000	427,658,000	1,320,000		100.00%	0	0	0
	0	251,000,000	12,800,000	0	530,000	530,000	0	0
	0	25,100,000	1,280,000	276,100,000	250,470,000	0	0	0
108 新見市長 2 市町村	0	276,100,000	14,080,000		99.79%	530,000	530,000	0
	500,000	158,000,000	0	0	237,450	0	0	0
	50,000	15,800,000	0	173,800,000	157,762,550	237,450	237,450	0
	550,000	173,800,000	0		99.85%	0	0	0

原価指南株式会社

『期間:XX/10/01～XX/10/31』『税選択:税抜』『売上区分:受注額』『金額/残高表示:すべて0円明細は表示しない』『未成・完成:両方』

税抜

Page. 1
20XX/11/10

左：今回金額／右：累計金額

[illegible]

現場担当別原価管理表/営業担当別原価管理表

〈A 3 横〉

工事ごとの請負額・発生原価・利益・売上請求・入金の状況が現場担当者・営業担当者集計の一覧で確認できます。

工事担当別原価管理表										税抜		Page. 1 20XX/11/10	
左：今回金額 / 右：累計金額													
現場代理人	請負金額		売上金額		入金金額		原価金額		材料費 労務費 外注費	直接経費 経費 1 経費 2	経費 3 経費 4		
	上段：税抜 / 中段：消費税 / 下段：税込				請負-入金	請負-原価 利益率							
103 杉山 雅博	24,000,000 2,400,000 26,400,000		12,000,000 1,200,000 13,200,000	12,000,000 1,200,000 13,200,000	26,400,000		24,000,000 100.00%						
104 柴田 久雄	24,000,000 2,400,000 26,400,000				26,400,000		24,000,000 100.00%						
108 加藤 健一	25,000,000 2,500,000 27,500,000		12,800,000 1,280,000 14,080,000	12,800,000 1,280,000 14,080,000	27,500,000	530,000	530,000 97.88%	530,000					
111 田中 博	600,000 60,000 660,000				660,000		600,000 100.00%						
204 西川 謙二	18,000,000 1,800,000 19,800,000				19,800,000		18,000,000 100.00%						
233 水谷 智子	34,000,000 3,400,000 37,400,000				37,400,000	1,004,020	1,004,020 32,995,980 97.05%	8,500 327,520	668,000				
251 奥村 健	1,000,000 100,000 1,100,000		5,000,000 500,000 5,500,000	5,000,000 500,000 5,500,000	56,100,000	1,706,600	1,706,600 49,293,400 96.65%	1,706,600					

営業担当別原価管理表										Page. 1		
税抜										20XX/11/10		
左：今回金額 / 右：累計金額												
営業担当者	請負金額		売上金額		入金金額		原価金額		材料費		経費 3	
	上段：税抜 / 中段：消費税 / 下段：税込	請負-入金	上段：税抜 / 中段：消費税 / 下段：税込	売上-原価	請負-入金	請負-原価	請負-原価	請負-原価	材料費	経費 1	経費 3	経費 4
101 鈴木 慎一郎	34,000,000 3,400,000 37,400,000	63,800,000			63,800,000	1,004,020 56,995,980 98.27%	1,004,020 56,995,980 98.27%	1,004,020 56,995,980 98.27%	8,500 327,520 530,000	668,000 327,520 530,000	668,000	
102 林 健二	600,000 60,000 660,000	28,160,000	12,800,000 1,280,000 14,080,000	12,800,000 1,280,000 14,080,000	28,160,000	530,000 25,070,000 97.93%	530,000 25,070,000 97.93%	530,000 25,070,000 97.93%				
103 杉山 雅博	18,000,000 1,800,000 19,800,000	19,800,000			19,800,000	18,000,000 100.00%	18,000,000 100.00%	18,000,000 100.00%				
106 後藤 清	24,000,000 2,400,000 26,400,000	26,400,000	12,000,000 1,200,000 13,200,000	12,000,000 1,200,000 13,200,000	26,400,000	24,000,000 100.00%	24,000,000 100.00%	24,000,000 100.00%				
107 山口 明夫	24,000,000 2,400,000 26,400,000	26,400,000			26,400,000	264,000 23,736,000 98.90%	264,000 23,736,000 98.90%	264,000 23,736,000 98.90%	10,000 254,000 254,000	10,000 254,000 254,000		

原価指南株式会社
『期間: XX/10/01 ~ XX/10/31』『税選択: 税抜』『売上区分: 受注額』『金額/残高表示: すべて円明細は表示しない』『未成・完成: 両方』

任意の工事の原価明細や工事利益、受注履歴が確認できます。原価明細は日付順・要素別日付順での印刷に対応します。

任意の工事の原価明細や工事利益、受注履歴が確認できます。原価明細は日付順・要素別日付順での印刷に対応します。

税拔

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社

『期間:XX/11/01~XX/11/30』

工 事	K2020001-00	営業担当者	沢井 茂喜
	中央駅南新築工事	現場代理人	奥村 健
工事場所	石川県金沢市野西4丁目213-5	主任技術者	奥村 健
発注者	木村不動産 (株)	工事原価	4,489,100
工事概要	タイプ2LDK、3LDK 世帯数3・2世帯	請負額-原価 実質利益率	46,510,900 91.20%
受注日/完成日	XX/09/25 / XX/03/31	入金額	5,500,000
契約工期	XX/10/01 ~ XX/03/10	未収入金	50,600,000
実施工期	XX/10/01 ~ XX/02/26	回収率	9.80%

受注（請負金額）			工事受入金		
日付	税抜金額	消費税額	税込金額	日付	金額
XX/09/25	50,000,000	5,000,000	55,000,000	XX/11/30	5,500,000
XX/10/01	1,000,000	100,000	1,100,000		
合計	51,000,000	5,100,000	56,100,000	合計	5,500,000

日付	品名 規格 業者	数量・単位	単価	税抜金額		消費税 外注費 経費 3	区分		税率	費目 工種 種別	備考 1 備考 2
				労務費 経費 2	材料費 経費 1		直接経費 経費 4				
伝票番号	《 繰越残高 》			1,706,600	0	170,660					
				0	0	0			0		
XX/11/30	廃棄物処理費 ボードコンテナ	10.00 個	30,000.0	300,000	300,000	30,000	外税	10.0%		(省略)	
211 富資源開発		未成材料費	0	0	0	0			0		
XX/11/30	廃棄物処理費 ゴミコンテナ	25.00 個	20,000.0	500,000	500,000	50,000	外税	10.0%		(省略)	
			500,000	0	0	0			0		

工事台帳(要素別日付順)

税拔

Page. 1
XX/12/10

原価指南株式会社

『期間:XX/11/01~XX/11/30』『全期間対象:OFF』

工 事	K2007/2001-00	営 業 当 担 者	沢 井 茂 喜	実 行 予 算	28,414,050
工 事 場 所	中央駅南新築工事	現 場 / 代 理 人	奥 村 健	目 標 利 益	22,585,950
発 注 者	石川県金沢市駅西4丁目1213-5	主 任 技 術 者	奥 村 健	目 標 利 益 率	44.29%
工 事 概 要	木村不動産 (株)	監 理 技 術 者		一 般 管 理 費	6,120,000
	タイプ2LDK、3LDK	部 門	建 築 部	目 標 純 利 益	16,465,950
	世帯数3+2世帯	工 事 原 価	4,489,100	目 標 純 利 益 率	32.29%
受 注 日 / 完 成 日	XX/09/25 / XX/03/31	請 負 額 - 原 価	46,510,900	入 金 額	5,500,000
契 約 工 期	XX/10/01 ~ XX/03/10	実 質 利 益 率	91.20%	未 収 入 金	50,600,000
実 施 工 期	XX/10/01 ~ XX/02/26	消 化 率	15.80%	回 収 率	9.80%
				合 計	56,100,000

日付 要素	品名 業者	要素内訳	数量	単位	単価	税抜金額 消費税	メモ
	《 繰越残高 》					1,706,600	
XX/11/30 材料費	廃棄物処理費 ボードコンテナ 富資源開発	未成材料費	10.00	個	30,000.0	170,660	
XX/11/30 材料費	廃棄物処理費 ゴミコンテナ 富資源開発	未成材料費	25.00	個	20,000.0	30,000	
XX/11/30 材料費	外注経費 仮囲い (有) シマダ工業	未成材料費	1.00	式	2,500.0	2,500	
XX/11/30 材料費	木造基礎 連続基礎 (株) 上川建設	未成材料費	1.00	式	1,560,000.0	1,560,000	
XX/11/30 材料費	土工 残土処分 (株) 上川建設	未成材料費	1.00	式	300,000.0	156,000	
						30,000	

任意の工事の原価明細や工事利益、受注履歴が確認できます。原価明細は要素別での印刷に対応します。

Page. 1
20XX/12/10

工事台帳(要秦別)

原価指南株式会社

『期間:XX/11/01~XX/11/30』『全期間対象:OFF』『品名別小計行:出力しない』

工 事	K2002-01-00	営業担当	沢井 茂喜	実行予算	28,414,050
工事場所	中央駅南新築工事	現場代理人	奥村 健	目標利益	22,585,950
発注者	石川県金沢市駄西4丁目1213-5	主任技術者	奥村 健	目標利益率	44.29%
工事概要	木村不動産(株) タイプ2LDK、3LDK 世帯数3+2世帯	監理技術者		一般管理費	6,120,000
		部門	建築部	目標純利益	16,465,950
受注日/完成日	XX/09/25 / XX/03/31	工事原価	4,489,100	目標純利益率	32.29%
契約工期	XX/10/01 ~ XX/03/10	請負額-原価	46,510,900	入金額	5,500,000
実施工期	XX/10/01 ~ XX/02/26	実質利益率	91.20%	未収入金	50,600,000
		消化率	15.80%	回収率	9.80%

受注 (請負金額)			
日付	税抜金額	消費税額	税込金額
XX/09/25	50,000,000	5,000,000	55,000,000
XX/10/01	1,000,000	100,000	1,100,000
合計	51,000,000	5,100,000	56,100,000

要素 要素内訳	品名 業者	数量	単位	単価	税抜金額 消費税	メモ
	《 繰越残高 》				1,706,600 170,660	
材料費 未成材料費	土工 残土処分 (株) 上川建設	1.00	式	300,000.0	300,000 30,000	
材料費 未成材料費	外注経費 仮囲い (有) シマダ工業	1.00	式	2,500.0	2,500 250	
材料費 未成材料費	外注経費 根切・ゴミ処分 アサテック (株)	1.00	式	120,000.0	120,000 12,000	
材料費 未成材料費	廃棄物処理費 ボードコンテナ 富資源開発	10.00	個	30,000.0	300,000 30,000	
材料費 未成材料費	廃棄物処理費 ゴミコンテナ 富資源開発	25.00	個	20,000.0	500,000 50,000	
材料費 未成材料費	木造基礎 連続基礎 (株) 上川建設	1.00	式	1,560,000.0	1,560,000 156,000	
	《 要素内訳計 》				2,782,500 278,250	
	《 要素計 》				2,782,500 278,250	
	《 総合計 》				4,489,100 448,910	

〈A 3 横/フリー〉

右) 工事別原価科目集計表では工事別に支出金勘定科目ごとの金額を一覧で確認できます。

36

工事原価推移表(要素別/業者別)

〈A 3 横〉

任意の工事の実行予算・発生原価との差異を要素別や業者別に確認できます。発生原価は6ヶ月または12ヶ月の推移で確認できます。

工事原価

原価指南株式会社

『期間:XX/07～XX/12』『税選択:税抜』『要素選択:要素』『業者選択:あり』

工事	222003-00	営業担当者	林 健二
	栗田邸新築工事	現場代理人	加藤 健一
工事場所	金沢市徳丸町5-8-41	主任技術者	後藤 清
発注者	栗田 吾郎	部門	建築部
工事概要		受注日/完成日	XX/09/22 /
		契約工期	XX/10/05 ~
		実施工期	XX/10/05 ~

要素 要素内訳	業者	原価金額	XX/06 迄	XX/07	XX/08
材料費		6,952,564	0	0	0
	(未定)	0	0	0	0
	配賦用業者	2,514	0	0	0
	コーン建材(株)	2,300,000	0	0	0
	(有) アイコーポレーション	340,000	0	0	0
	小松工務店(株)	830,000	0	0	0
	金沢建材(株)	2,600,050	0	0	0
	(株) 高橋木工所	880,000	0	0	0
労務費		1,934	0	0	0
	(未定)	0	0	0	0
	配賦用業者	1,934	0	0	0
外注費		967	0	0	0
	(未定)	0	0	0	0
	配賦用業者	967	0	0	0
直接経費		196,189	0	0	0
	(未定)	0	0	0	0
	配賦用業者	6,189	0	0	0
	(株) 池太組	190,000	0	0	0
《 総 合 計 》		7,151,654	0	0	0

推移表(要素別) 税抜

Page. 1
20XX/11/29

		当初	変更	要素名	実行予算	予算残高
	請負金額	25,000,000	0	材料費	4,650,000	-2,302,564
	実行予算	19,495,050	19,525,000	労務費	2,460,000	2,458,066
	一般経費	3,000,000	3,000,000	外注費	12,415,000	12,414,033
XX/03/31	計	22,495,050	22,525,000	直接経費	0	-196,189
XX/03/32	目標利益	2,504,950	2,475,000			
XX/03/33	利益率	10.02%	9.90%	合計	19,525,000	12,373,346

XX/09	XX/10	XX/11	XX/12	メモ
0	340,000	3,430,050	3,182,514	
0	0	0	0	
0	0	0	2,514	
0	0	0	2,300,000	
0	340,000	0	0	
0	0	830,000	0	
0	0	2,600,050	0	
0	0	0	880,000	
0	0	0	1,934	
0	0	0	0	
0	0	0	1,934	
0	0	0	967	
0	0	0	0	
0	0	0	967	
0	190,000	0	6,189	
0	0	0	0	
0	0	0	6,189	
0	190,000	0	0	
0	530,000	3,430,050	3,191,604	

見込売上一覧表

〈A 3 横〉

工事の進捗率を入力することで現時点損益(請負額×進捗率－発生原価)が把握できます。また、工事ごとの労務延べ人数により生産性向上一覧表などのデータ分析ができます。(延人数は、日報からの集計、原価金額による算出、手入力の3通りから選択できます。)

見込

原価指南株式会社

『表示順:工事順 昇順』 『対象年月:XX/10』 『未収金0円表示:0円も表示』

『原価0円表示:今回原価(≠0)のみ表示』 『未成・完成:両方』

[illegible]

壳上一覧表

Page. 1
20XX/10/31[illegible]

生産性向上一覧表

〈A 3 横〉

年間計画(労働生産性)に対する進捗状況を把握できます。基準年度に対する増減率の管理に対応します。

生産性向上一

原価指南株式会社

『表示順:工事順 昇順』 『対象年月:XX/10』

『見込0円表示:今回見込売上(≠0)のみ表示』 『前期完成表示:前期完成は対象外』

『未成・完成:両方』

工事 発注者 部門		受注日	完成日	営業担当者 現場代理人					
		契約工期 実施工期			請負	進捗率	見込売上	予算	原価
D2001001-00 105 1	県道 1 5 号線道路改良工事 (株) 土津戸土木 土木部	XX/10/06	XX/03/31	鈴木 慎一郎 林 健二	34,000	3.50%	1,190		1,004
		XX/10/06	XX/01/31		34,000	3.50%	1,190		1,004
		XX/10/06	XX/05/20		34,000	3.50%	1,190	27,514	1,004
K2002001-00 1021 2	中央駅南新築工事 木村不動産(株) 建築部	XX/09/25	XX/03/31	沢井 茂喜 奥村 健	1,000	4.00%	2,040		1,707
		XX/10/01	XX/03/10		51,000	4.00%	2,040		1,707
		XX/10/01	XX/02/26		51,000	4.00%	2,040	28,414	1,707
K2002003-00 107 2	栗田邸新築工事 栗田 吾郎 建築部	XX/09/22	XX/03/31	林 健二 加藤 健一	0	4.00%	1,000		530
		XX/10/05	XX/03/31		25,000	4.00%	1,000		530
		XX/10/05	XX/03/31		25,000	4.00%	1,000	19,495	530
S2003001-00 108 3	第2工区弦下町配管布設工事 源歌町長 設備部	XX/09/30	XX/12/31	林 卓郎 高橋 次郎	500	4.00%	320		237
		XX/10/01	XX/12/31		8,000	4.00%	320		237
		XX/10/01	XX/12/27		8,000	4.00%	320	3,930	237
V2004002-00 113 4	第一小学校2～3F電灯改修工事(進行基準) (株) 吉田組開発 電気部	XX/10/22		小川 慎一郎 岩田 敦	750	70.00%	525		396
		XX/10/25	XX/11/07		750	70.00%	525		396
		XX/10/25	XX/11/07		750	70.00%	525	0	396
W2005001-00 105 5	国道2号線道路改良工事 (株) 土津戸土木 舗装部	XX/10/01	XX/02/10	林 健二 柴田 久雄	30,000	0.10%	37		29
		XX/10/01	XX/02/28		30,000	0.10%	37		29
		XX/10/01	XX/01/19		30,000	0.10%	37	31,345	29
《 総 合 計 》					66,250	3.44%	5,112		3,903
					148,750	3.44%	5,112		3,903
					148,750	3.44%	5,112	110,698	3,903

覽表

千円単位

Page. 1
20XX/10/31

労働生産性				
年度累計付加価値	2,263	付加価値／人(基準:11年度)	30	増減率
年度累計社内延人数	74	付加価値／人(計画)	30	1.00%
年度累計外注延人数	0	付加価値／人(年度実績)	31	1.93%



上段　今回　／　中段　年度累計　／　下段　累計										
予算残	予算消化率	計画粗利	粗利	労務費	外注費	付加価値	社内延人数	外注延人数	付加価値／人	付加価値率
26,510	3.65%	6,486	186	328	0	514	60	0	9	156.78%
			186	328	0	514	60	0	9	156.78%
			186	328	0	514	60	0	9	156.78%
26,707	6.01%	22,586	333	0	0	333	0	0	0	0.00%
			333	0	0	333	0	0	0	0.00%
			333	0	0	333	0	0	0	0.00%
18,965	2.72%	5,505	470	0	460	930	0	0	0	202.17%
			470	0	460	930	0	0	0	202.17%
			470	0	460	930	0	0	0	202.17%
3,693	6.04%	4,070	83	237	0	320	12	0	27	134.77%
			83	237	0	320	12	0	27	134.77%
			83	237	0	320	12	0	27	134.77%
-396	0.00%	750	129	0	0	129	0	0	0	0.00%
			129	0	0	129	0	0	0	0.00%
			129	0	0	129	0	0	0	0.00%
31,316	0.09%	-1,345	8	29	0	37	2	0	19	128.47%
			8	29	0	37	2	0	19	128.47%
			8	29	0	37	2	0	19	128.47%
106,795	3.53%	38,052	1,209	594	460	2,263	74	0	31	214.74%
			1,209	594	460	2,263	74	0	31	214.74%
			1,209	594	460	2,263	74	0	31	214.74%

年間計画(労働生産性)に対する2年間の実績推移を金額とグラフで確認できます。

生産性向上

原価指南株式会社
『年度:XX/06/29』『未成・完成:両方』

		XX/01	XX/02	XX/03	XX/04	XX/05	XX/06	XX/07	XX/08	XX/09	XX/10	XX/11
年間	年度	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
	付加価値／人(基準:11年度)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	付加価値／人(計画)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	付加価値目標率	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
	付加価値／人(前年度実績)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
当月	見込売上	23,246	10,875	22,522	9,320	7,250	23,800	27,000	2,700	3,300	3,000	3,300
	原価	21,662	9,705	19,861	5,746	4,243	22,030	24,700	2,000	2,000	2,000	2,000
	粗利	1,584	1,170	2,661	3,574	3,007	1,770	2,300	700	1,300	1,000	1,300
	労務費	645	211	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
	外注費	6,595	5,300	5,005	0	1,088	1,928	0	0	0	0	0
	付加価値	8,824	6,681	7,666	3,574	4,095	3,698	2,300	1,700	2,300	2,000	2,300
	社内労務人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外注労務人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	付加価値／人	30	30	28	29	29	31	29	34	29	33	33
年度累計	付加価値	8,824	15,505	23,171	26,745	30,841	34,539	36,839	38,539	40,839	42,839	45,139
	社内労務人数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外注労務人数	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	付加価値／人	30	30	29	29	29	29	29	30	30	30	30
	付加価値／人(基準増加率)	0.73%	-0.03%	-1.86%	-2.25%	-2.28%	-1.77%	-1.92%	-1.33%	-1.50%	-0.97%	-0.49%
	付加価値／人(前年増加率)	-0.08%	-0.83%	-2.64%	-3.03%	-3.06%	-2.55%	-2.70%	-2.12%	-2.28%	-1.76%	-1.28%

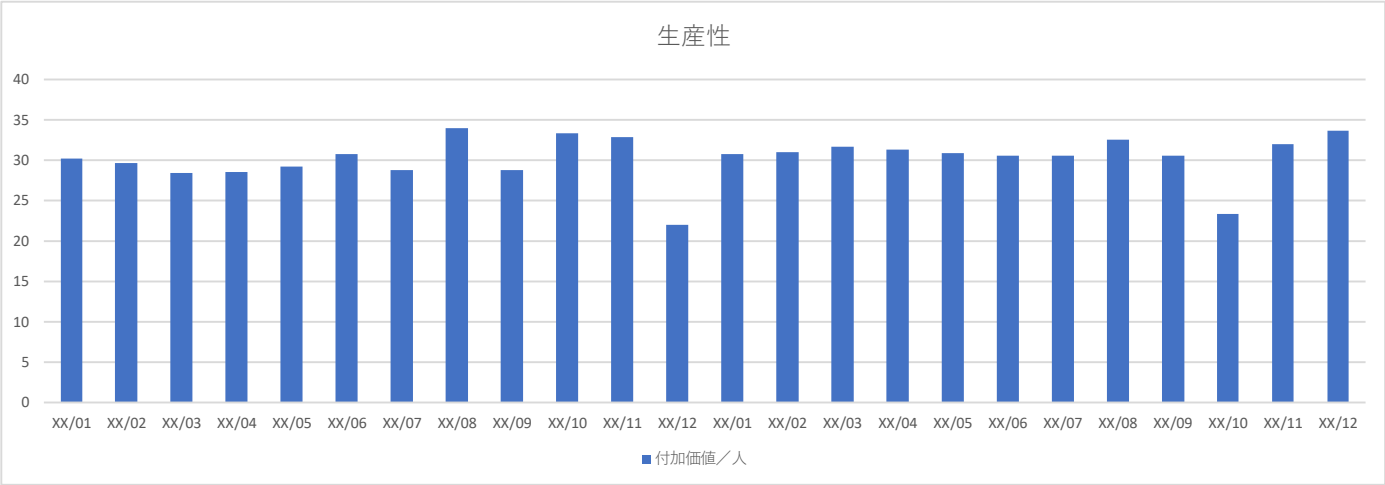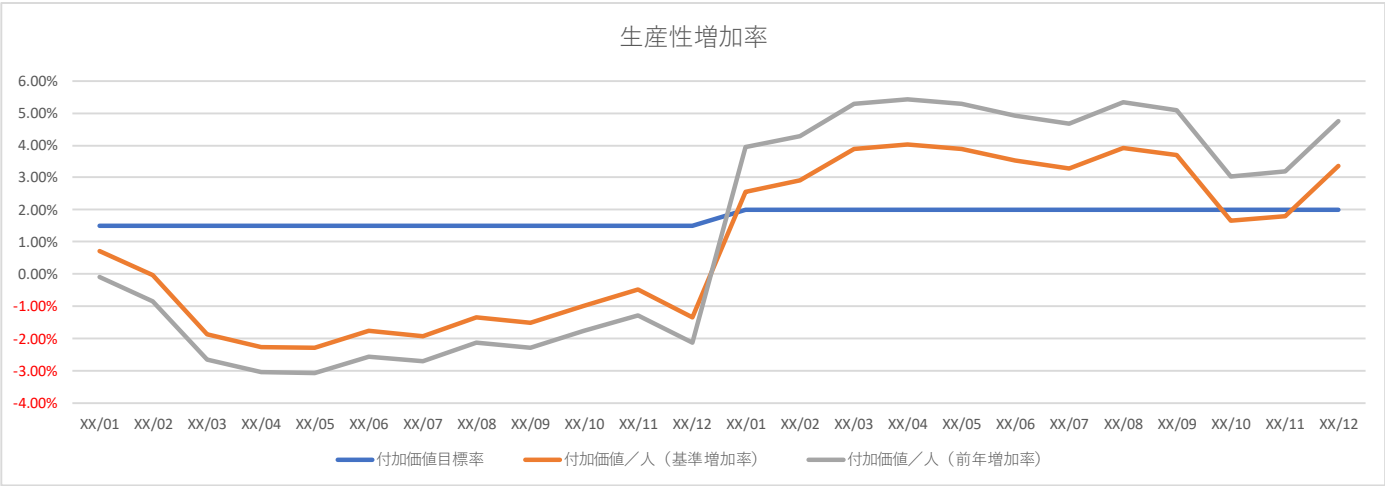


推移表

千円単位


Page. 1
20XX/01/15

XX/12	XX/01	XX/02	XX/03	XX/04	XX/05	XX/06	XX/07	XX/08	XX/09	XX/10	XX/11	XX/12
2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
1.50%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	31
2,100	3,000	3,600	3,600	3,600	2,700	3,600	3,600	3,600	3,600	2,400	1,800	5,550
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
100	1,000	1,600	1,600	1,600	700	1,600	1,600	1,600	1,600	400	-200	3,550
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,100	2,000	2,600	2,600	2,600	1,700	2,600	2,600	2,600	2,600	1,400	800	4,550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	31	31	32	31	31	31	31	33	31	23	32	34
46,239	2,000	4,600	7,200	9,800	11,500	14,100	16,700	19,300	21,900	23,300	24,100	28,650
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31
-1.33%	2.56%	2.91%	3.90%	4.03%	3.88%	3.52%	3.28%	3.93%	3.69%	1.66%	1.82%	3.35%
-2.11%	3.94%	4.29%	5.29%	5.43%	5.28%	4.91%	4.67%	5.33%	5.09%	3.02%	3.18%	4.74%

年度生産性増加率

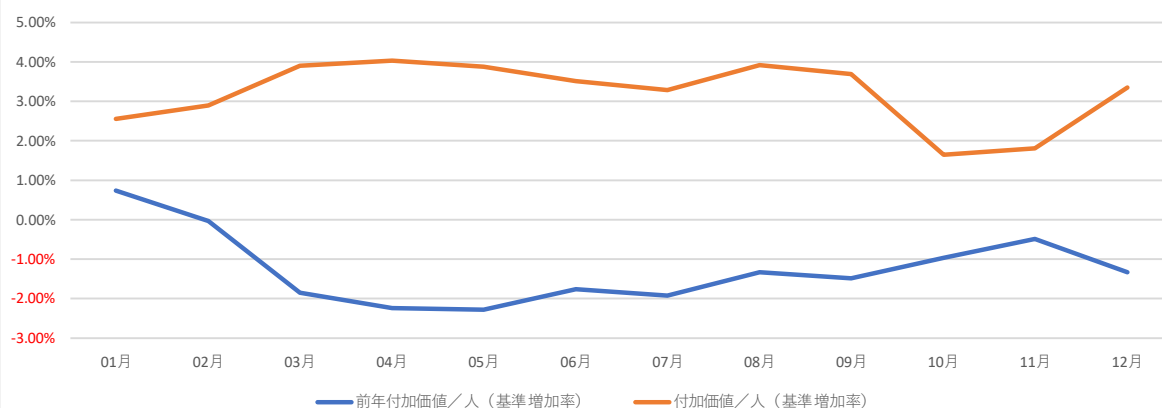

年度生産性

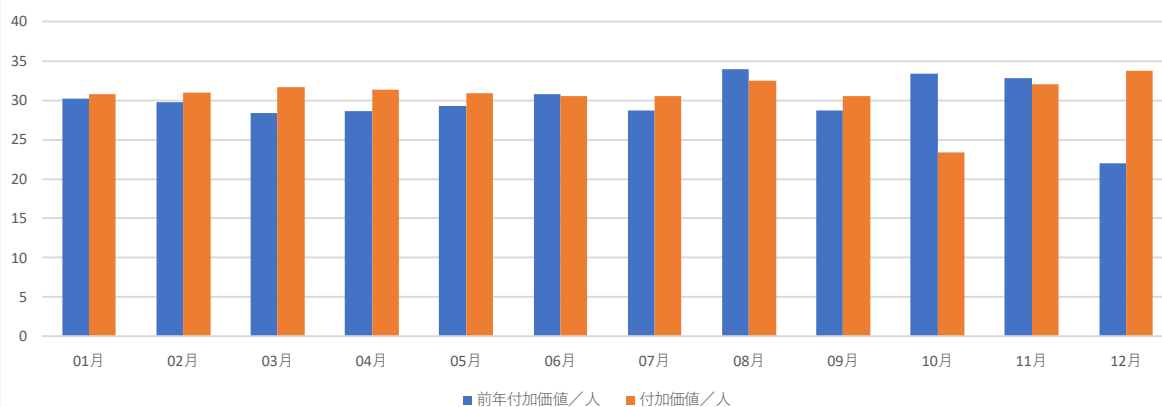

受注推移表



〈A 3 横〉

工事登録された情報を元に工事件数・発注者件数・受注金額・平均単価の実績が年間の月次推移で確認できます。

受注

原価指南株式会社
『期間:XX/01～XX/12』 『未成・完成:両方』

	年月	XX/01	XX/02	XX/03	XX/04	XX/05
工事件数	当年	41	30	35	37	23
	前年	30	29	28	27	26
	前年比	136.67%	103.45%	125.00%	137.04%	88.46%
	増加率	36.67%	3.45%	25.00%	37.04%	-11.54%
発注者件数	当年	8	7	8	8	8
	前年	8	8	8	7	8
	前年比	100.00%	87.50%	100.00%	114.29%	100.00%
	増加率	0.00%	-12.50%	0.00%	14.29%	0.00%
受注金額	当年	41,200	32,450	38,320	49,650	24,860
	前年	30,000	30,450	30,800	31,050	31,200
	前年比	137.33%	106.57%	124.42%	159.90%	79.68%
	増加率	37.33%	6.57%	24.42%	59.90%	-20.32%
平均単価	当年	1,005	1,082	1,095	1,342	1,081
	前年	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200
	前年比	100.49%	103.02%	99.53%	116.69%	90.07%
	増加率	0.49%	3.02%	-0.47%	16.69%	-9.93%

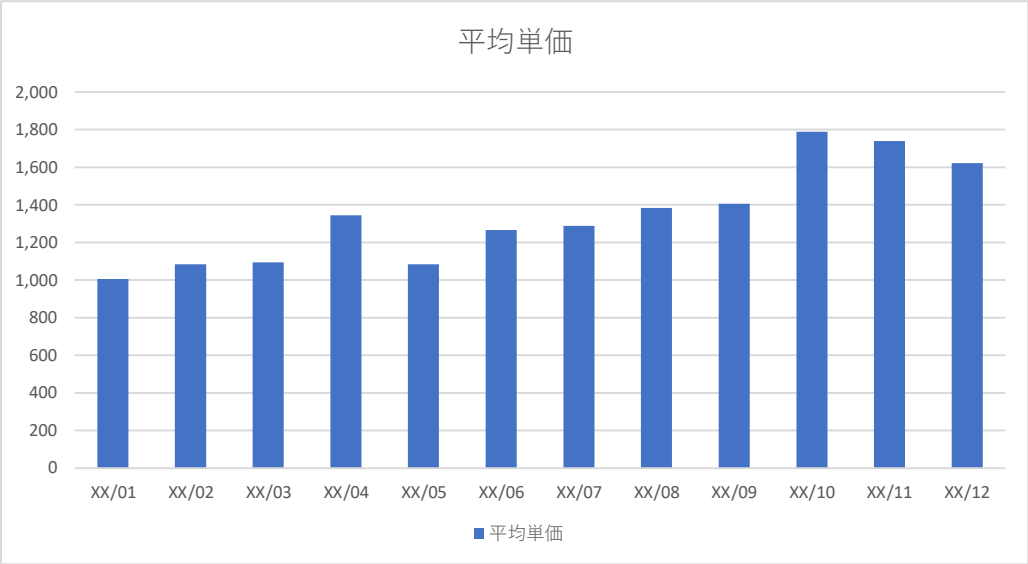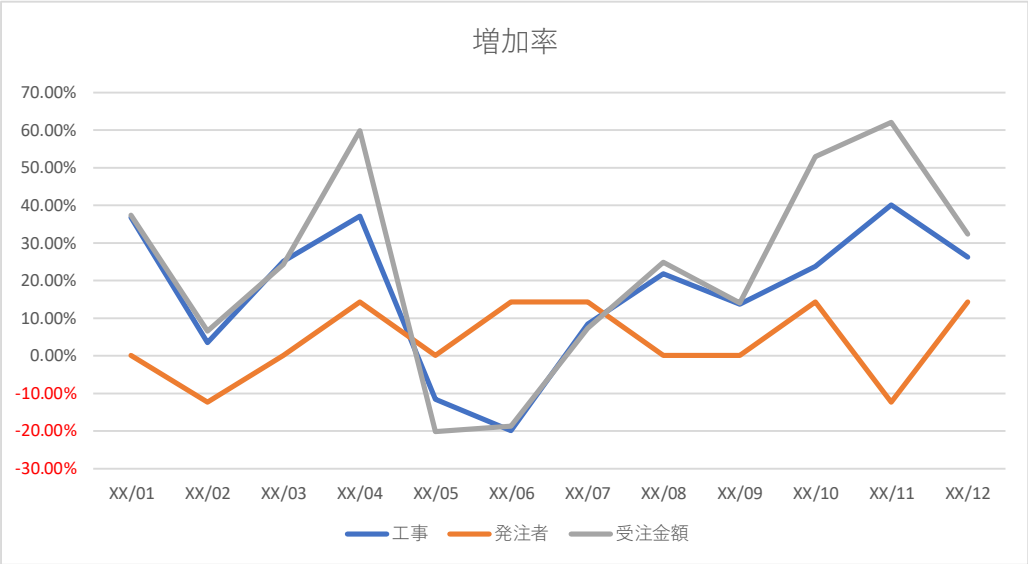

推移表

税抜

千円単位

Page. 1

20XX/01/15

XX/06	XX/07	XX/08	XX/09	XX/10	XX/11	XX/12
20	26	28	25	26	28	24
25	24	23	22	21	20	19
80.00%	108.33%	121.74%	113.64%	123.81%	140.00%	126.32%
-20.00%	8.33%	21.74%	13.64%	23.81%	40.00%	26.32%
8	8	8	8	8	7	8
7	7	8	8	7	8	7
114.29%	114.29%	100.00%	100.00%	114.29%	87.50%	114.29%
14.29%	14.29%	0.00%	0.00%	14.29%	-12.50%	14.29%
25,340	33,451	38,742	35,125	46,586	48,635	38,954
31,250	31,200	31,050	30,800	30,450	30,000	29,450
81.09%	107.21%	124.77%	114.04%	152.99%	162.12%	132.27%
-18.91%	7.21%	24.77%	14.04%	52.99%	62.12%	32.27%
1,267	1,287	1,384	1,405	1,792	1,737	1,623
1,250	1,300	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550
101.36%	98.97%	102.49%	100.36%	123.57%	115.80%	104.72%
1.36%	-1.03%	2.49%	0.36%	23.57%	15.80%	4.72%

前年比



年間の限界利益を月次・累計で確認できます。1年間のほか、2年・3年比較が可能です。また、期首に年間計画を組むことで達成率や差異の確認も可能です。

限界利益確認表

原価指南株式会社

(3 カ年)

Page. 1

『表示順:工事順 昇順』『対象年月:XX/12』『集計年数:3年(対象年月~2年前)』


XX/01/15

『出来高0円表示:累計出来高売上(≠0)のみ表示』『未収金0円表示:0円も表示』


	今回	累計	年間
計画	2,000,000	24,000,000	24,000,000
実績	4,550,000	28,650,000	28,650,000
達成率	227.50%	119.38%	119.38%
差異	2,550,000	4,650,000	4,650,000

月	XX年度		XX年度		XX年度	
	当月限界利益	年度累計限界利益	当月限界利益	年度累計限界利益	当月限界利益	年度累計限界利益
1月	0	0	2,228,650	2,228,650	2,000,000	2,000,000
2月	0	0	1,381,000	3,609,650	2,600,000	4,600,000
3月	0	0	2,661,316	6,270,966	2,600,000	7,200,000
4月	0	0	3,574,480	9,845,446	2,600,000	9,800,000
5月	0	0	3,007,398	12,852,844	1,700,000	11,500,000
6月	0	0	1,770,000	14,622,844	2,600,000	14,100,000
7月	0	0	2,300,000	16,922,844	2,600,000	16,700,000
8月	0	0	1,700,000	18,622,844	2,600,000	19,300,000
9月	0	0	2,300,000	20,922,844	2,600,000	21,900,000
10月	1,802,900	1,802,900	2,000,000	22,922,844	1,400,000	23,300,000
11月	1,978,465	3,781,365	2,300,000	25,222,844	800,000	24,100,000
12月	1,086,866	4,868,231	1,100,000	26,322,844	4,550,000	28,650,000

限界利益

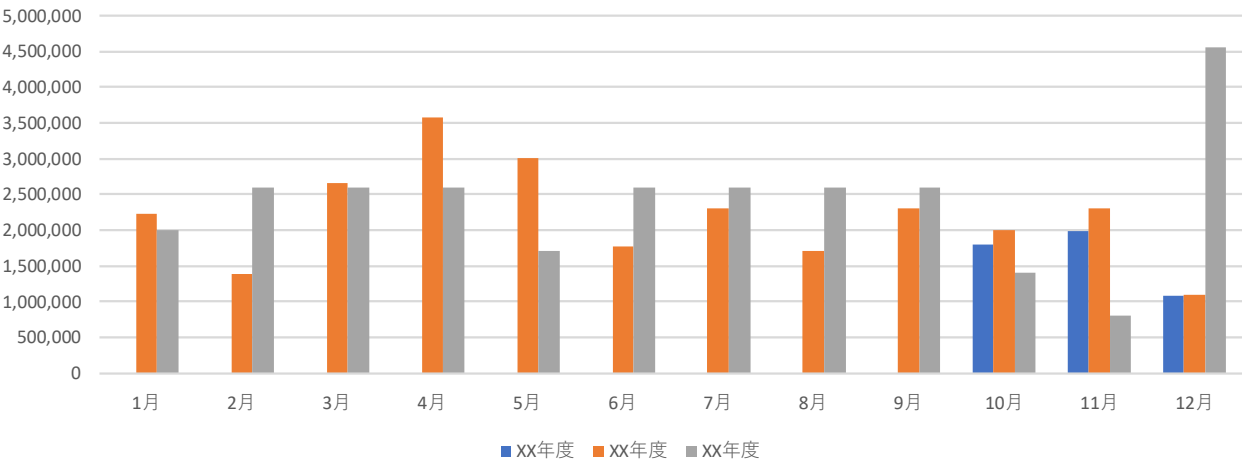

年度限界利益

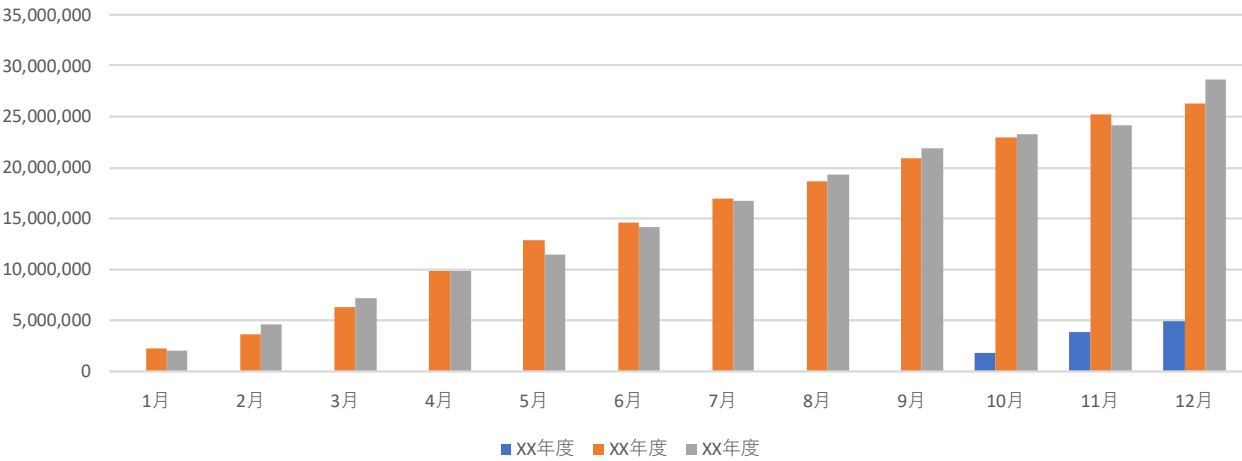

仕訳データ確認表/仕訳データ受入リスト/勤怠データ確認表

〈A 4 横〉

左)会計ソフトへ転送・受入前の仕訳伝票データ(仕入・支払・売上・入金)を確認できます。
完成振替の転送にも対応し、仕訳・変換パターンはお客様それぞれの設定が可能です。
右)出面(勤怠)データを給与ソフトに転送する前の確認用です。

Page. 1
20XX/12/15
*: 転送済

仕入

仕訳データ確認表

日付 伝票番号 転送済	借方		工事 取引先 工種	要素内訳 摘要 1 摘要 2	貸方		税区分 / 税率 金額 消費税
	税区分 / 税率 金額 消費税	勘定科目 補助科目 部門			勘定科目 補助科目 部門		
XX/11/20 19000102	5 / 10.0% 621,000 62,100	1135 未成工事支出金		10000 未成材料費	2112 工事未払金 115 (株) 成和産業 北陸営業所	0 / 0.0% 683,100	0
XX/11/30 4	5 / 10.0% 303,000 21,300	1135 未成工事支出金		帝王ビル新築工事 30000 未成外注費	2112 工事未払金 211 中川組 (株)	0 / 0.0% 324,300	0
XX/11/30 5	5 / 10.0% 4,282,260 363,226	1135 未成工事支出金		吉田邸新築工事 30000 未成外注費	2112 工事未払金 116 (株) 金五郎商店	0 / 0.0% 4,645,486	0
XX/11/30 101	5 / 10.0% 15,219,000	1135 未成工事支出金		10000 未成材料費	2112 工事未払金 111 吉田生コンクリート (株)	0 / 0.0% 16,740,900	0

原価指南株式会社
『日付:XX/11/01~XX/11/30』『転送種類:伝票単位』『転送方式:全て』

Page. 1
20XX/12/10
*:エラー有

仕訳データ受入リスト

日付 エラー	工事 部門 業者	費目 工種 品名	借方		貸方		税抜金額 消費税 税込金額
			勘定科目 補助科目 要素内訳	勘定科目 補助科目	勘定科目 補助科目	勘定科目 補助科目	
XX/11/30	D2001001-00 県道15号線道路改良工事 1土木部 113松岡 (株)	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	1264 未成交通費		2112 工事未払金		6,182 618 6,800
XX/11/30	D2001001-00 県道15号線道路改良工事 1土木部 117 コーン建材 (株)	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	50064 交通費		2112 工事未払金		11,636 1,164 12,800
XX/11/30	D2001001-00 県道15号線道路改良工事 1土木部 211 中川組 (株)	103 現場管理費 192 現場管理費 0000-0999-009999 *	1252 未成水道光熱費		2112 工事未払金		3,409 341 3,750
XX/11/30	D2001001-00 県道15号線道路改良工事	103 現場管理費	50051 電力費		2112 工事未払金		7,273

原価指南株式会社
『期間:20XX/11/01~20XX/11/30』『業者:212~215』『工事:D2001001-00~D2001001-00』

Page. 1
20XX/01/15

勤怠データ確認表

社員		社員区分	就業内(h)	普通残業(h)	深夜残業(h)	早出残業(h)	休日(h)	手当1(日)	手当2(回)	日数
104 柴田 久雄	1社員		100.00	2.00			8.00			14.00
105 中村 秀樹	1社員		104.00	3.00						13.00
106 後藤 清	1社員		128.00							16.00
109 田中 信二	1社員		16.00							2.00
111 田中 博	2作業員		32.00							4.00
112 渡辺 宏	2作業員		4.00							1.00
113 山田 健太郎	2作業員		160.00	14.00	1.00		8.00			21.00
114 佐藤 一郎	2作業員		56.00				8.00			8.00
115 石原 次郎	2作業員		72.00							9.00
117 西川 隆宏	2作業員		104.00							13.00
118 松嶋 七雄	2作業員		38.00	2.00						5.00
119 岡村 信吾	2作業員		8.00							1.00
120 矢部 正則	2作業員		8.00							1.00

原価指南株式会社
『期間:XX/12/01~XX/12/31』『処理年月:XX/01』『日数計算方式:出勤回数を転送』

業者一覧表(基本情報/支払情報)/業者タックシール

〈A 4 横/縦〉

業者登録された支払業者の基本情報・支払情報の登録一覧表です。また、業者登録された情報を元にタックシール印刷ができます。

業者一覧表

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社

『表示順:コード順 昇順』『業者:111~116』

業 者		フリガナ		TEL	取扱品目・業種	業者区分	担当者	締日	税計算	
		敬称		FAX			代表者		支払	税端数
		住 所		許認可番号			注文種類		作成日	金額端数
メールアドレス	〒				担当部署	許認可取得年月日	業者採用区分	更新日		
					契約締結番号		申請状況			
111	吉田生コンクリート 株式会社	ショダナコン		06-4303-6406	生コンクリート、セメント一式	1 材料関係	吉田 和夫	31日	明細単位	
		御中				A	吉田 神五郎	31日	切り捨て	
		大阪府堺市西区浜寺公園町3-16				材料			四捨五入	
		浜寺公園町ランド211				継続	XX/08/16			
		592-8346								
112	ミワ管工 三和 敬一	ミワコウ		03-0550-2185	管工事一式	1 材料関係	三和 敬一	31日	伝票単位	
		様		03-0550-2185				31日	切り捨て	
		東京都中央区東日本橋2-2				材料			四捨五入	
						継続	XX/08/16			
		103-0004								

業者一覧表 (支払情報)

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社

『表示順:コード順 昇順』『業者:111~211』

コード	業者 名称	支払		種目・口座番号 口座名義人 手数料負担	基準額1 手形率1 端数額1	基準額2 手形率2 端数額2	基準額3 手形率3 端数額3	協会費 固定費 協会費率 端数額	会計情報				
		現金・振込区分							21 現金 22 振込 23 手数料	24 手形 25 郵送料 31 相殺	32 協会費 33 協会費2 34 値引	35 諸控除 36 諸控除2	
		支払月 支払日	振込銀行名 振込支店名										
111 遊廊印刷	吉田生コンクリート 株式会社	1 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)	1 普通 0555666	500,000	0	0	0	2101 現金	2431 手形	3281 協会費	3571 控除		
		1ヶ月後 31日	0010 りそな銀行 111 梅田支店	3074ナマコン(株) 2 先方負担	50.0% 10,000	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	2211 振込(みずほ) 2321 手数料(みずほ)	2541 郵送料 3161 相殺	3281 協会費 3451 値引	3571 控除	
		1 会社口座 1 (みずほ銀行東京営業部)	1 普通 1111111	500,000	0	0	0	0	2101 現金	2431 手形	3281 協会費	3571 控除	
112	ミワ管工 三和 敬一	1ヶ月後 31日	0118 みちのく銀行 018 栄町支店	3074ナマコン(株) 2 先方負担	50.0% 10,000	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	2211 振込(みずほ) 2321 手数料(みずほ)	2541 郵送料 3161 相殺	3281 協会費 3451 値引	3571 控除	
		2 会社口座 2 (三井住友銀行新宿支店)	1 普通 5055588	500,000	0	0	0	0	2101 現金	2431 手形	3281 協会費	3571 控除	
		1ヶ月後 31日	0147 福井銀行 50	マツカバ(株) 2 先方負担	50.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.3% 0	2211 振込(みずほ) 2541 郵送料	3281 協会費 3571 控除	3571 控除		
114	松開発産業 株式会社	1 会社口座 1											
		1ヶ月後 31日	00 04										
		1 会社口座 1											
115	株式会社 成和産業 北陸営業所	1ヶ月後 31日	01 50										
		0 現金											
		1ヶ月後 31日											
116	株式会社 金五郎商店	1 会社口座 1											
		1ヶ月後 31日											
		1 会社口座 1											
117	コーン建材 株式会社	1ヶ月後 31日	00 34										
		1 会社口座 1											
		1ヶ月後 31日	00 50										
119	株式会社 早田倉庫 金沢支店	1 会社口座 1											
		1ヶ月後 31日	00 50										

592-8346 大阪府堺市西区浜寺公園町3-16 浜寺公園町ランド211	103-0004 東京都中央区東日本橋2-2
吉田生コンクリート 株式会社 御中	ミワ管工 三和 敬一 様
111	112
811-1365 福岡県福岡市南区皿山2-12-10	818-0036 福岡県筑紫野市光が丘3-7-19 光が丘グリーン217

592-8346
大阪府堺市西区浜寺公園町3-16
浜寺公園町ランド211

吉田生コンクリート 株式会社 御中

111

811-1365
福岡県福岡市南区皿山2-12-10

松岡 株式会社 御中

113

999-7681
山形県鶴岡市平形3-1-11
平形シーサイド115

株式会社 成和産業
北陸営業所 御中

115

103-0004
東京都中央区東日本橋2-2

ミワ管工
三和 敬一 様

112

818-0036
福岡県筑紫野市光が丘3-7-19
光が丘グリーン317

松開発産業 株式会社 御中

114

405-0004
山梨県山梨市上之割1-2-9
ロイヤル上之割111

株式会社 金五郎商店 御中

116

業者評価表(製品納入業者/施工業者)

〈A 4 縦〉

製品納入業者・施工業者ごとの業者評価に対応します。評価10項目を設定できます。

業者評価表（施工業者）

Page. 1

原価指南株式会社

20XX/12/10

承認	確認	作成

業者名	中川組 株式会社	電話番号	04-3740-1156
住所	埼玉県狭山市広瀬1-9	FAX番号	04-3740-1157
代表者名	中川 進一	担当者名	田中課長
業種	とび土工事一般		

評価項目

1	財務の安全性・収益性・資金力
2	雇用管理・労働条件
3	経営者の資質および我が社への適応性
4	機械・機器等の整備および確保
5	施工実績
6	労働力の確保
7	安全管理および適応能力
8	有資格者の確保
9	社内標準化・規格の程度
10	品質活動への取り組み状況 (ISO/QC)

総合評価点

コメント

☒ 採用 ☐ 条件付き採用

【作業ルート】

【現場代理人：作成】→【工務部長：評価判定】→【営業総務部長：確認】→【社長：承認】

※ 総合評価 60点以上採用（条件付きは条件を明示のこと）

最終保管：営業総務部長

業者評価表（製品納入業者）

Page. 1

原価指南株式会社

20XX/12/10

承認	確認	作成

業者名	吉田生コンクリート 株式会社	電話番号	06-4303-6406
住所	大阪府堺市西区浜寺公園町3-16	FAX番号	06-4303-6407
代表者名	吉田 神五郎	担当者名	吉田 和夫
主要商品	生コンクリート、セメント一式	状況表の有無	☐ 有 ☒ 無

評価項目

1	会社規模	点数	9	備考
2	我が社への納入実績	9		
3	会社の技術力	9		
4	我が社への協力度	9		
5	営業担当の能力・適正	9		
6	見積、仕様願書類の提出	9		
7	搬入時の協力度	9		
8	搬入時の安全管理	9		
9	社内標準化・規格の程度	9		
10	品質活動への取り組み状況 (ISO/QC)	8		

総合評価点

89

コメント

☒ 採用 ☐ 条件付き採用 ☐ 再教育の上採用 ☐ 不採用

【作業ルート】

【現場代理人：作成】→【工務部長：評価判定】→【営業総務部長：確認】→【社長：承認】

※ 総合評価 60点以上採用（条件付きは条件を明示のこと）

最終保管：営業総務部長

発注者一覧表(基本情報/回収情報)

〈A 4 横/縦〉

発注者(得意先)登録された基本情報・回収情報の登録一覧表です。また、発注者登録された情報を元にタックシール印刷ができます。

発注者一覧表

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社
『表示順:コード順 昇順』

発注者		フリガナ 敬称	TEL FAX	住所		発注者区分 ランク	担当者 代表者	税計算 税端数	締日 金額端数
101	東川建設 株式会社	トウシカワ 御中	088-858-9761	786-0081	高知県高岡郡四万十町中村3-19 ゴールドン中村317	同業者 B	東川 三郎 吉田 胡桃	締日単位 四捨五入	31日 切り捨て
102	長野土木総合事務所	ナガノドウボウ 御中	026-959-7975	399-9511	長野県北安曇郡小谷村中土2-3	官公庁		明細単位 切り捨て	31日 四捨五入
103	佐賀市役所土木課	サガシヤクショ 御中	0952-92-5555	840-0863	佐賀県佐賀市嘉瀬町十五2-5-14	市町村	小森 英介	締日単位 四捨五入	31日 切り捨て
104	北秋田市土木事務所	キタアキタシ 御中	0182-96-8556 0182-96-8556	018-4741	秋田県北秋田市阿仁幸屋3-15 阿仁幸屋産105	官公庁	野本 友哉	締日単位 四捨五入	31日 切り捨て
105	株式会社横浜土木	ヨコハマドウボウ 御中	044-900-8436 044-900-8436	231-0854	神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7	元請先	泉 真吾	締日単位 四捨五入	31日 切り捨て
106	松阪開発公団	マサカハイ 御中	059-948-9397	515-2351	三重県松阪市嬉野井之上町1-14-1	元請先	駒井 勝	締日単位 四捨五入	31日 切り捨て
107	栗田 吾郎	クリタゴロウ 様	0537-99-3845	439-0006	静岡県菊川市堀之内4-9-17 堀之内キャッスル118	一般民間		明細単位 切り捨て	31日 四捨五入
108	新見市長 本多宗次	シミチョウ 殿	086-061-6610	719-2801	岡山県新見市神郷釜村2-11-5	市町村		明細単位 切り捨て	31日 四捨五入

発注者一覧表 (回収情報)

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社
『表示順:コード順 昇順』

発注者		回収月日	銀行	21 現金	24 手形	32 協会費	35 諸控除
コード 指定請求	名称	回収担当者 回収区分	支店	22 振込	25 郵送料	33 協会費2	36 諸控除2
				23 手数料	31 相殺	34 値引	
101	東川建設 株式会社	翌月末日 振込	0005 三菱東京UFJ銀行 020 日本橋支店	2101 現金 2211 振込(みずほ普通) 3521 手数料	2431 手形 9999 * 3561 相殺	3541 安全協力会費 3541 安全協力会費 3551 値引	9999 *
102	長野土木総合事務所	翌月末日 その他		2101 現金 2211 振込(みずほ普通) 3521 手数料	2431 手形 9999 * 3561 相殺	3541 安全協力会費 3541 安全協力会費 3551 値引	9999 *
103	佐賀市役所土木課	翌月末日 その他		2101 現金 2211 振込(みずほ普通) 3521 手数料	2431 手形 9999 * 3561 相殺	3541 安全協力会費 3541 安全協力会費 3551 値引	9999 *
104	北秋田市土木事務所	翌月末日 林 健二		2101 現金 2211 振込(みずほ普通)	2431 手形 9999 *	3541 安全協力会費 3541 安全協力会費	9999 *

105	株式会社横浜土木
106	松阪開発公団
107	栗田 吾郎
108	新見市長 本多宗次
112	ミワ開発 株式会社
113	株式会社 吉田組開
114	佐伯町役場
116	株式会社 中村

786-0081 高知県高岡郡四万十町中村3-19 ゴールドン中村317 東川建設 株式会社 御中	399-9511 長野県北安曇郡小谷村中土2-3 長野土木総合事務所 御中
101	102
0952-92-5555 佐賀県佐賀市嘉瀬町十五2-5-14 佐賀市役所土木課 御中	018-4741 神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7 北秋田市土木事務所 御中
103	104
231-0854 神奈川県横浜市中区根岸旭台3-7 株式会社横浜土木 御中	515-2351 三重県松阪市嬉野井之上町1-14-1 松阪開発公団 御中
105	106

社員登録された社員情報を登録台帳形式と一覧表形式で印刷できます。

社員情報

Page. 1

20XX/12/10

承認

確認

作成

原価指南株式会社

『表示順:コード順 昇順』『社員:101~101』

コード	101	
社員名	鈴木 慎一郎	
フリガナ	スズキシンイチロウ	
性別	男血液型	○
生年月日	昭和XX年3月3日	
入社年月日	平成2年8月5日	

住所	920-8530 石川県金沢市鞍月東2丁目1番地
TEL	076-291-9999 090-1234-0123

部門	2 建築部
社員区分	1 社員
備考	

原価業者	1 社内原価	単位	税区分
原価品名	0000-0010-000010 監督	人	税無
単価項目	単位	単 価	
1 就業内	h	3,500.0	
2 普通残業	h	4,375.0	
3 深夜残業	h	5,250.0	
4 早出残業	h	4,375.0	
5 休日	h	4,550.0	
6 手当1	日	500.0	
7 手当2	回		
8 手当3	日		

摘 要

社員一覧表

Page. 1

20XX/12/10

原価指南株式会社

『表示順:コード順 昇順』『社員:101~111』

社員名 フリガナ TEL 1	社員区分 部門 TEL 2	住所		性別 血液型 年齢	就業内(h)	普通残業(h)	深夜残業(h)
		生年月日	入社日		早出残業(h) 手当2(回)	休日(h) 手当3(日)	手当1(日) 手当4(日)
101 鈴木 慎一郎 スズキシンイチロウ 076-291-9999	1 社員 2 建築部 090-1234-0123	921-8002 金沢市玉鉾2丁目502	昭和XX年3月3日 平成XX年8月5日	男 O 50歳	3,500.0 4,375.0	4,375.0 4,550.0	5,250.0 500.0
102 林 健二 ハヤシケンジ 076-299-5342	9 その他 2 建築部 090-4444-5555	921-8001 金沢市高島8丁目571番22号	昭和XX年3月5日 平成XX年8月5日	男 O 50歳	3,500.0 4,375.0 3,000.0	4,375.0 4,550.0 3,000.0	5,250.0 500.0 3,000.0
103 杉山 雅博 スギヤマサヒロ 076-284-9876	9 その他 2 建築部 090-1323-1212	920-0926 石川県金沢市曉町4丁目512	昭和XX年1月5日 平成XX年8月5日	男 AB 50歳	3,500.0 4,375.0 3,000.0	4,375.0 4,550.0 3,000.0	5,250.0 500.0 3,000.0
104 柴田 久雄 シバタヒサオ 076-253-1119	9 その他 2 建築部 090-5435-4343	920-0813 石川県金沢市御所町タ152	昭和XX年2月8日 平成XX年8月5日	男 B 50歳	3,500.0 4,375.0 3,000.0	4,375.0 4,550.0 3,000.0	5,250.0 500.0 3,000.0
105 中村 秀樹 ナカムラヒデキ 076-211-6803	9 その他 2 建築部 090-9953-5533	920-1154 石川県金沢市太陽が丘3-46	昭和XX年3月1日 平成XX年8月5日	男 A 45歳	3,500.0 4,375.0 3,000.0	4,375.0 4,550.0 3,000.0	5,250.0 500.0 3,000.0
106 後藤 清 ゴトウキヨシ 076-288-9977	9 その他 2 建築部 090-9953-5533	921-0053 石川県金沢市豊田町ヲ123	昭和XX年7月23日 平成XX年8月5日	男 B 45歳	3,500.0 4,375.0 3,000.0	4,375.0 4,550.0 3,000.0	5,250.0 500.0 3,000.0
107 山口 明夫 ヤマグチアキオ 076-777-8568	1 社員 2 建築部 090-9953-5533	921-8003 石川県金沢市東力1丁目186	昭和XX年8月30日 平成XX年8月5日	男 AB 45歳	2,400.0 3,000.0	3,000.0 3,120.0	3,600.0 500.0
108 加藤 健一 カトケンイチ 076-255-5544	1 社員 2 建築部 090-9953-5533	920-0841 石川県金沢市浅野本町4-2-2	昭和XX年9月5日 平成XX年4月5日	男 O 45歳	2,400.0 3,000.0	3,000.0 3,120.0	3,600.0 500.0
109 田中 信二 タナカシンジ 076-244-4664	1 社員 2 建築部 090-9953-5533	920-0303 石川県金沢市法島町1-6	昭和XX年12月30日 平成XX年12月1日	男 A 40歳	2,400.0 3,000.0	3,000.0 3,120.0	3,600.0 500.0
110 岡本 孝博 オカモトカヒロ 076-222-0123	1 社員 2 建築部 090-9953-5533	921-0811 石川県金沢市白井町5-234	昭和XX年11月1日 平成XX年4月1日	男 A 40歳	2,400.0 3,000.0	3,000.0 3,120.0	3,600.0 500.0
111 田中 博 タナカヒロシ 0761-22-3212	2 作業員 2 建築部 090-9953-5533	923-0033 石川県小松市野田町丁593	平成XX年5月27日 平成XX年4月1日	男 A 30歳	2,400.0 3,000.0	3,000.0 3,120.0	3,600.0 3,000.0

53

〈A 4 縦〉

原価指南株式会社

Page. 1

20XX/8/23

承認	確認	作成

コード	101		
社員名	鈴木 慎一郎		
フリガナ	スズキ シンイチロウ		
性別	男	血液型	○
生年月日	昭和XX年3月3日		
入社年月日	平成XX年8月5日		

住所	921-8002 金沢市玉鉾2丁目502
T E L	076-291-9999 090-1234-0123
部門	2 建築部

[illegible]

Page. 1

どっと建設株式会社
『資格コード:1003~1003』

摘 要

[illegible]

機械一覧表/保有設備一覧表

〈A 4 横〉

保有する機械等の基本情報や原価に関連する情報の一覧表です。

機械一覧表

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社
『表示順:コード順 昇順』『機械:101～501』

機械名 フリガナ	担当者	機械区分 登録日	購入金額 購入日付	原価計上		税区分 単位	稼働時間 日 月	単価	
				業者	品名			自社(h) 未利用(日)	自社(日) 未利用(日)
101 ブルドーザ 4t No.221-5023 ブルドーザ 4	101 鈴木 慎一郎	重機 99/04/01	8,500,000	1 社内原価	0000-0013-000002 ブルドーザ 4t	税無 日	6.00 0.00	1,250.0	10,000.0
102 ブルドーザ 4t No.222-3044 ブルドーザ 4	102 林 健二	重機 01/09/01	8,600,000	1 社内原価	0000-0013-000033 ダンプトラック 4t	税無 日	6.00 0.00	1,250.0	10,000.0
103 ブルドーザ 6t No.567-0188 ブルドーザ 6	103 杉山 雅博	重機 99/04/01	11,000,000	1 社内原価	0000-0013-000032 ダンプトラック 2t	税無 日	6.00 0.00	3,000.0	24,000.0
201 ダンプトラック4t A ダンプ	104 柴田 久雄	重機 98/10/01	3,500,000	1 社内原価	0000-0013-000033 ダンプトラック 4t	税無 日	6.00 0.00	1,500.0	12,000.0
202 ダンプトラック4t B ダンプ	105 中村 秀樹	重機 98/10/01	3,500,000	1 社内原価	0000-0013-000033 ダンプトラック 4t	税無 日	6.00 0.00	3,000.0	24,000.0
203 ダンプトラック4t C ダンプ	106 後藤 清	重機 04/11/01	3,600,000	1 社内原価	0000-0013-000033 ダンプトラック 4t	税無 日	6.00 0.00	4,000.0	24,000.0
204 ダンプトラック2t D ダンプ	107 山口 明夫	重機 05/01/01	3,600,000	1 社内原価	0000-0013-000032 ダンプトラック 2t	税無 日	6.00 0.00	2,000.0	10,000.0
301 バックホ0.35m3 (7215) バックホ	108 加藤 健一	重機 99/04/01	6,200,000	1 社内原価	0000-0013-000022 バックホ 0.35m3	税無 日	6.00 0.00	3,340.0	15,000.0
302 バックホ0.35m3 (9143) バックホ	109 田中 信二	重機 01/09/01	6,250,000	1 社内原価	0000-0013-000022 バックホ 0.35m3	税無 日	6.00 0.00	3,340.0	15,000.0
303 バックホ0.6m3 AS1000 バックホ	110 岡本 孝博	重機 99/04/01	0	1 社内原価	0000-0013-000023 バックホ 0.60m3	税無 日	6.00 0.00	4,000.0	18,000.0
304 バックホ0.6m3 CM200 バックホ	111 田中 博	重機 98/10/01	0	1 社内原価	0000-0013-000023 バックホ 0.60m3	税無 日	6.00 0.00	4,000.0	18,000.0
401 振動ロー 0.8-1.1tハンドガイド シフトロー	112 渡辺 宏	その他 98/10/01	0	1 社内原価	0000-0013-000020 振動ロー ハンドガイド	税無 日	8.00 0.00	650.0	5,000.0
451 モータグレーダ モータグレーダー	113 山田 健太郎	重機 04/11/01	0	1 社内原価	0000-0013-000141 モータグレーダ 油圧式	税無 日	0.00 0.00	1,000.0	8,530.0
452 タイヤロー 8～20t タイヤロー	114 佐藤 一郎	重機 05/01/01	0	1 社内原価	0000-0013-000181 タイヤロー	税無 日	8.00 0.00	550.0	4,420.0
453 マダグムロー 10～12t マダグムロー	115 石原 次郎	重機 99/04/01	0	1 社内原価	0000-0013-000161 ロードロー マダグム	税無 日	0.00 0.00	1,240.0	9,920.0
501 社用バン 11号車 ジャヨウバン	116 中村 正人	工事車両 01/09/01	650,000	1 社内原価	0000-0013-000501 社用バン	税無 h	1.00 0.00	500.0	4,000.0

保有設備一覧表

Page. 1
20XX/12/10

原価指南株式会社
『表示順:コード順 昇順』『機械:101～502』

機械名 フリガナ	機械区分	メーカー名 形式	製造番号 性能機能	燃料種 排気量	検査日 校正日	次回検査日 次回校正日	機械備考
101 ブルドーザ 4t No.221-5023 ブルドーザ 4	1 重機	カナザワ 4D94LE-2	B654983 直接噴射式	1 軽油 3,053.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
102 ブルドーザ 4t No.222-3044 ブルドーザ 4	1 重機	カナザワ 4D94E-1A	B4287398 直接噴射式	2,775.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
103 ブルドーザ 6t No.567-0188 ブルドーザ 6	1 重機	カナザワ SAA4D102E-2-B	B69873923 直接噴射式	3,920.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
201 ダンプトラック4t A ダンプ	1 重機	ミツノ FU-4DT	DT6736983 直6インタークーラーターボ	12,882.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
202 ダンプトラック4t B ダンプ	1 重機	ミツノ MT-DT4	DT90390 直6インタークーラーターボ	12,882.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
203 ダンプトラック4t C ダンプ	1 重機	ミツノ MT-D4DX	DT63222930 直6インタークーラーターボ	12,882.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
204 ダンプトラック2t D ダンプ	1 重機	ミツノ MT-DT2D	DT103837 直6インタークーラーターボ	12,882.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
301 バックホ0.35m3 (7215) バックホ	1 重機	カナザワ SAA4D102E-2	B35793274 直接燃料噴射式、油圧式	3,920.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
302 バックホ0.35m3 (9143) バックホ	1 重機	カナザワ SAA4D102E-2	B3576383 直接燃料噴射式、油圧式	3,920.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
303 バックホ0.6m3 AS1000 バックホ	1 重機	カナザワ SAA6D102E-2-A	B6253733 直接噴射式、油圧式	5,883.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
304 バックホ0.6m3 CM200 バックホ	1 重機	カナザワ SAA6D102E-2-A	B633292 直接噴射式、油圧式	5,883.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
401 振動ロー 0.8-1.1tハンドガイド シフトロー	9 その他	カナザワ TV08-H	SR00007608 油圧式	400.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
451 モータグレーダ モータグレーダー	1 重機	カナザワ MG407-E	MG063E9 3.1m	6,000.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
452 タイヤロー 8～20t タイヤロー	1 重機	TOWA TR-AE200	TR0639262 8～20t	6,000.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
453 マダグムロー 10～12t マダグムロー	1 重機	TOWA MR-DX	MR-DX87252 10t～12t	6,000.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
501 社用バン 11号車 ジャヨウバン	2 工事車両	タイヨー E-EE108G	BN8739191 水冷直列4気筒SOHC	1,456.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	
502 社用バン 12号車 ジャヨウバン	2 工事車両	タイヨー X-CE108G	BN842283 水冷直列4気筒SOHC	1,974.0	XX/04/01 XX/11/01	XX/09/01 XX/01/01	



経営管理システム

原価指南

G E N K A S H I N A N

< 開発元 >



一ゆとりある企業づくりをサポートする一

株式会社建設ドットウェブ
<https://kendweb.net>

〒920-8203
本社 石川県金沢市鞍月4丁目115番地 金沢ジーサイドビル3階
TEL:076-225-8400 FAX:076-225-8407
拠点 東京支店、名古屋営業所、大阪支店、福岡営業所

< 監修 >



一般社団法人 原価管理研究会
<https://scc-k.net>

〒103-0015
東京都中央区日本橋箱崎町36番2号
Daiwaリバーゲート北ウイング16階
㈱建設ドットウェブ東京支店内
TEL:03-4400-1033 FAX:03-6667-6063
